

「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、5月から7月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。


作業概要

- ◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- ◆作業時間 原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時
- ◆大型連休期間（平成29年4月29日～5月7日）
平成29年4月30日と5月3日～5月7日は休工とします。

作業箇所




工所用道路

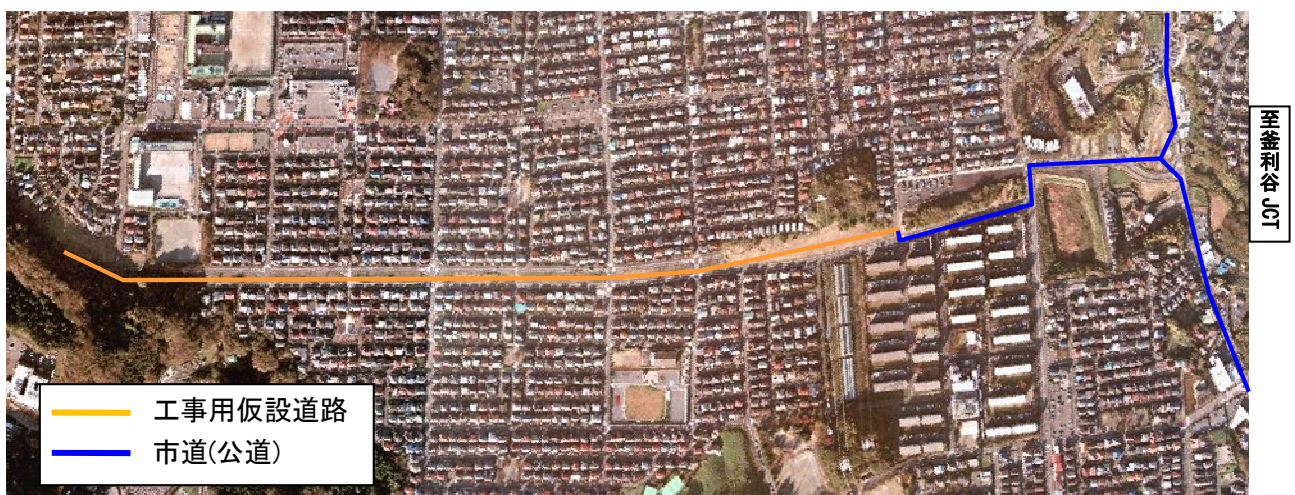

完成イメージ図


橋梁下部工部

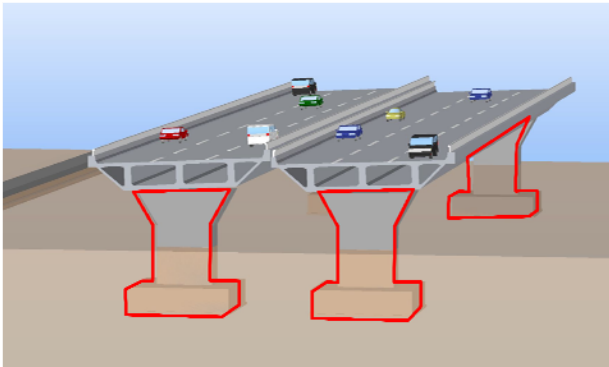


土工部




函渠部

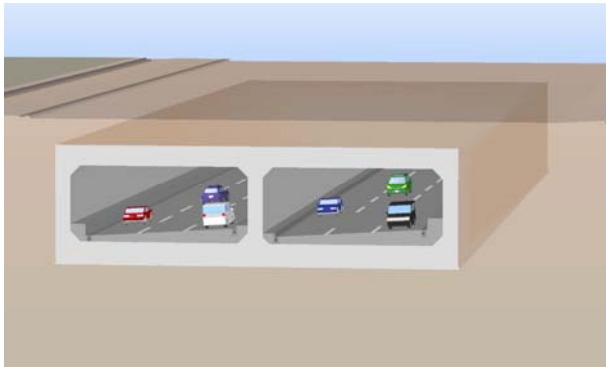

立坑部

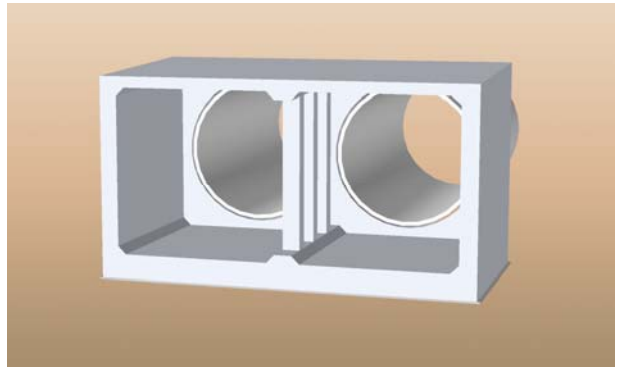

シールドトンネル部

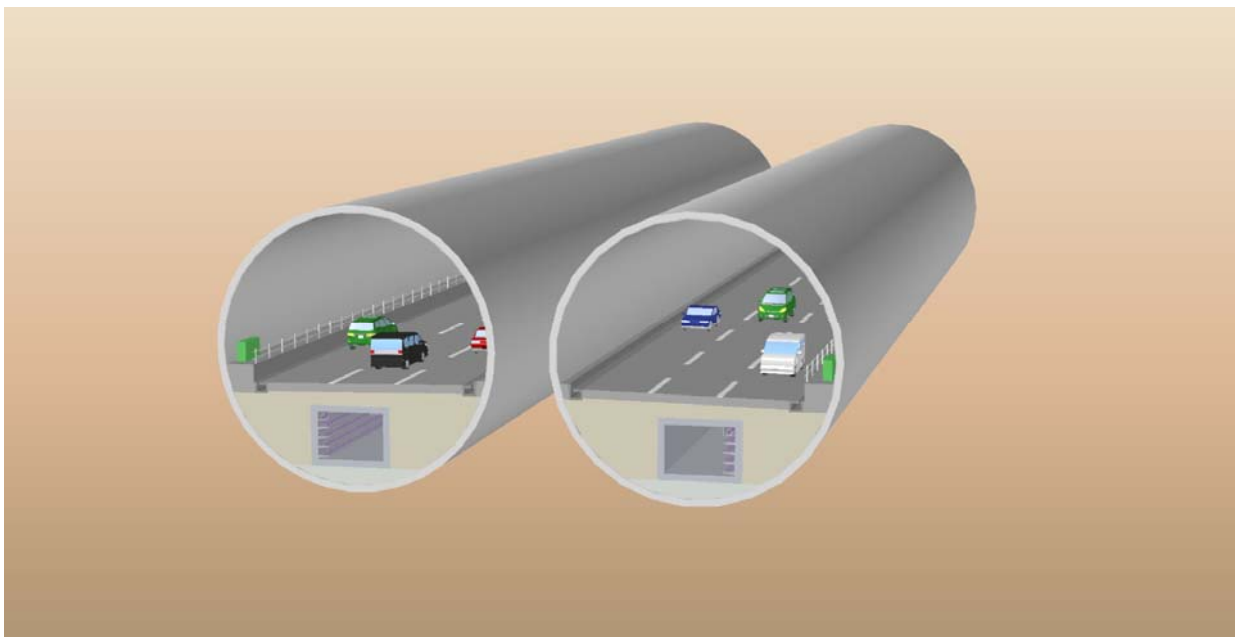

作業工程表

作業箇所	主な作業内容	この先3カ月の作業予定		
		5月	6月	7月
橋梁下部工区	① 構造物構築工	██████████		
	② 敷地造成工	██████████	██████████	
	③ 土留工	██████████	██████████	
	④ 掘削工			██████████
土工区	⑤ 調整池改修工	██████████	██████████	██████████
	⑥ 擁壁工	██████████	██████████	
	⑦ 敷地造成工			██████████
函渠工区	⑧ 地盤改良工	██████████	██████████	
	⑨ 埋設管対策工	██████████	██████████	██████████
	⑩ 土留工	██████████	██████████	██████████
	⑪ 敷地造成工			██████████
発進立坑工区	⑫ 掘削工	██████████	██████████	██████████
回転立坑工区	⑬ 土留工	██████████		
	⑭ 地盤改良工	██████████	██████████	
	⑮ 掘削工			██████████

・天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

主な作業内容

- ① 構造物構築工：鉄筋を組み立て、コンクリートを型枠に流し込み、橋梁下部工を構築する工事です。
- ②⑦⑪ 敷地造成工：敷地内の掘削造成や作業構台設置など工事用の作業ヤードを整備する工事です。
- ③⑩⑬ 土留工：地面の掘削を行う際に、土砂の崩落を防ぐ工事です。
- ④⑫⑮ 掘削工：橋梁下部工及び立坑部分の地面を掘削する工事です。
- ⑤ 調整池改修工：コンクリート製ブロックの設置などを行い、調整池の貯水量を確保する工事です。
- ⑥ 擁壁工：鋼管で造った壁の表面をコンクリートで仕上げ、擁壁上に管理用の通路を造る工事です。
- ⑧⑭ 地盤改良工：地盤を強固にするために地中部へ改良材を注入する工事です。
- ⑨ 埋設管対策工：工事に支障となる地下埋設管（下水道管）の移設などを行う工事です。

大型連休の休工中の安全対策

- ① 休工前までに一斉点検を行います。
- ② 工事箇所出入口の門扉は強固に固定し、施錠を行います。
- ③ 休工期間中は、施工者職員が1名常駐し、2回/日の現場巡回点検を行います。
- ④ 巡回点検では、以下の確認を行います。
 1. 工事箇所出入口の施錠確認
 2. 仮囲いおよび門扉の異常の有無
 3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
 4. 現場休憩所の施錠確認
 5. 現場休憩所の異常の有無
- ⑤ 大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時も施工者職員が巡回点検を行い異常の有無を確認します。

工事進捗状況

写真撮影位置図




■状況写真

写真A (4月25日撮影)



写真B (4月25日撮影)

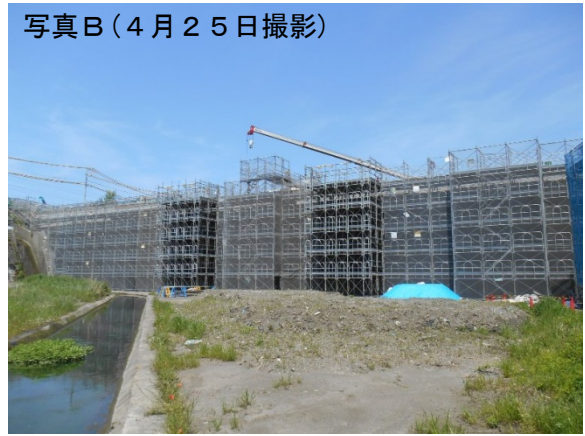

写真C (4月25日撮影)



写真D (4月25日撮影)



【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所
 上郷桂台工事区 工事長 大塚 行輝 TEL. 045-352-3771 (代表)
 施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV
 現場代理人 松村 英樹 TEL. 045-392-3985
