

「横浜環状南線 公田笠間トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、8月から10月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

【作業日】

平日及び祝日は通常作業、土曜・日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止

【作業時間】


地上部での作業：原則8時～21時 ※大型車両の通行は原則9時～17時
回転立坑内での作業：終日（夜間作業あり）

作業箇所


【工事箇所】



地理院地図(国土地理院) (<https://www.gsi.go.jp>) をもとに、東日本高速道路㈱が加工

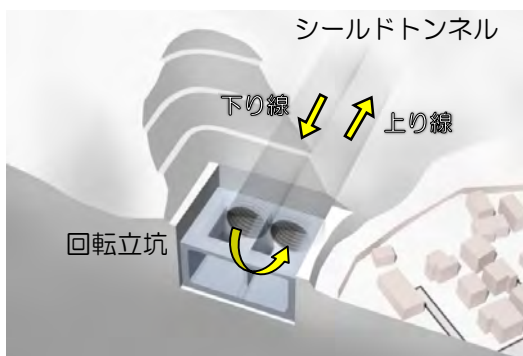

回転立坑イメージ

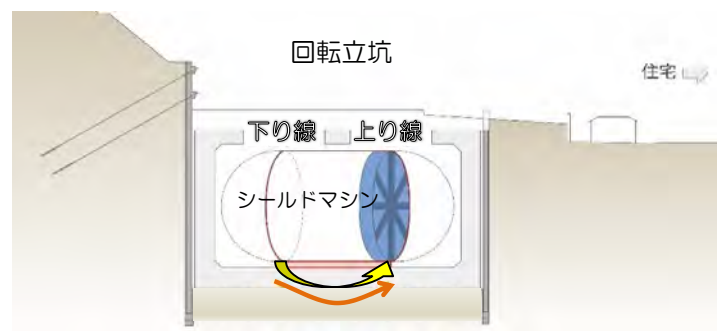


シールド機回転イメージ

作業箇所詳細図



縦断面図

現在段取り替え中、10月下旬から上り線本掘進開始予定

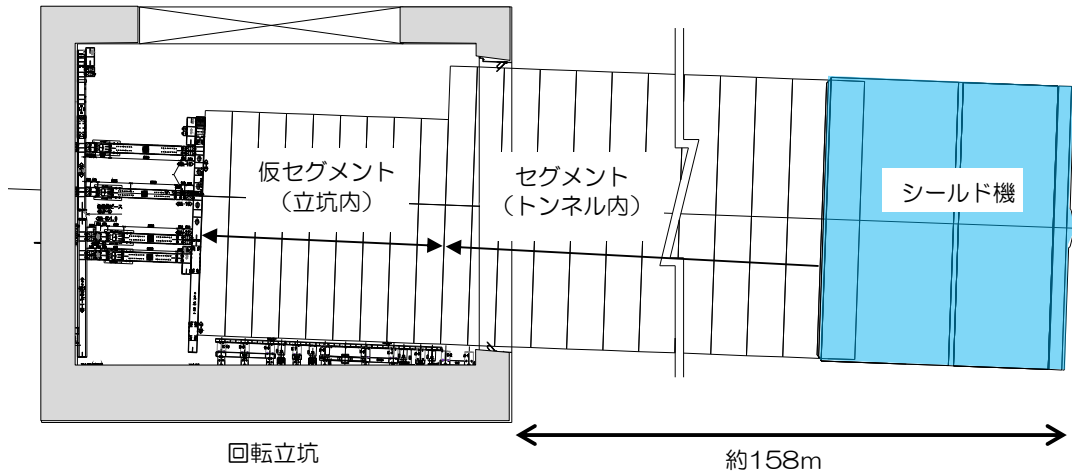

作業工程表と主な作業内容

【作業工程表及び主な作業内容】

作業内容	この先 3ヶ月の作業予定								
	8月			9月			10月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①シールド段取替え工		夏季休暇							
②シールド掘進工									

①シールド段取替え工	今後の本掘進作業に必要な設備の組立・設置を行います。
②シールド掘進工	シールド機が掘進し、セグメントを設置して上り線トンネルを構築します。


- ・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。
- ・引き続き、21時以降は開閉式防音屋根を閉鎖した立坑内で夜間作業を行います。
- ・夏季休暇は、8月10日(土)～8月18日(日)の予定です。

工事進捗状況

【回転立坑】



全景写真(R6.7撮影)

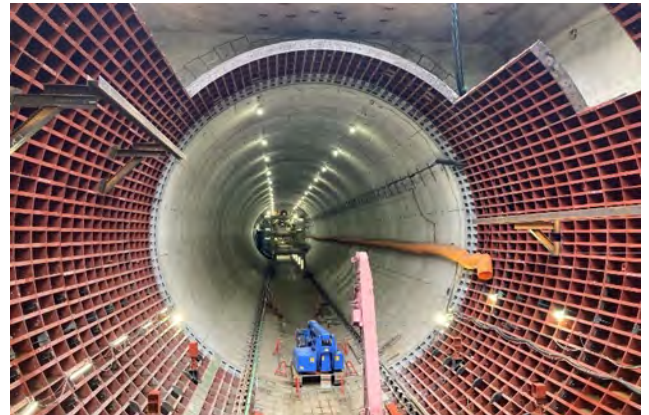


上り線トンネル内(R6.7撮影)

【シールド掘進進捗状況】

令和6年7月8日現在

回転立坑から158m

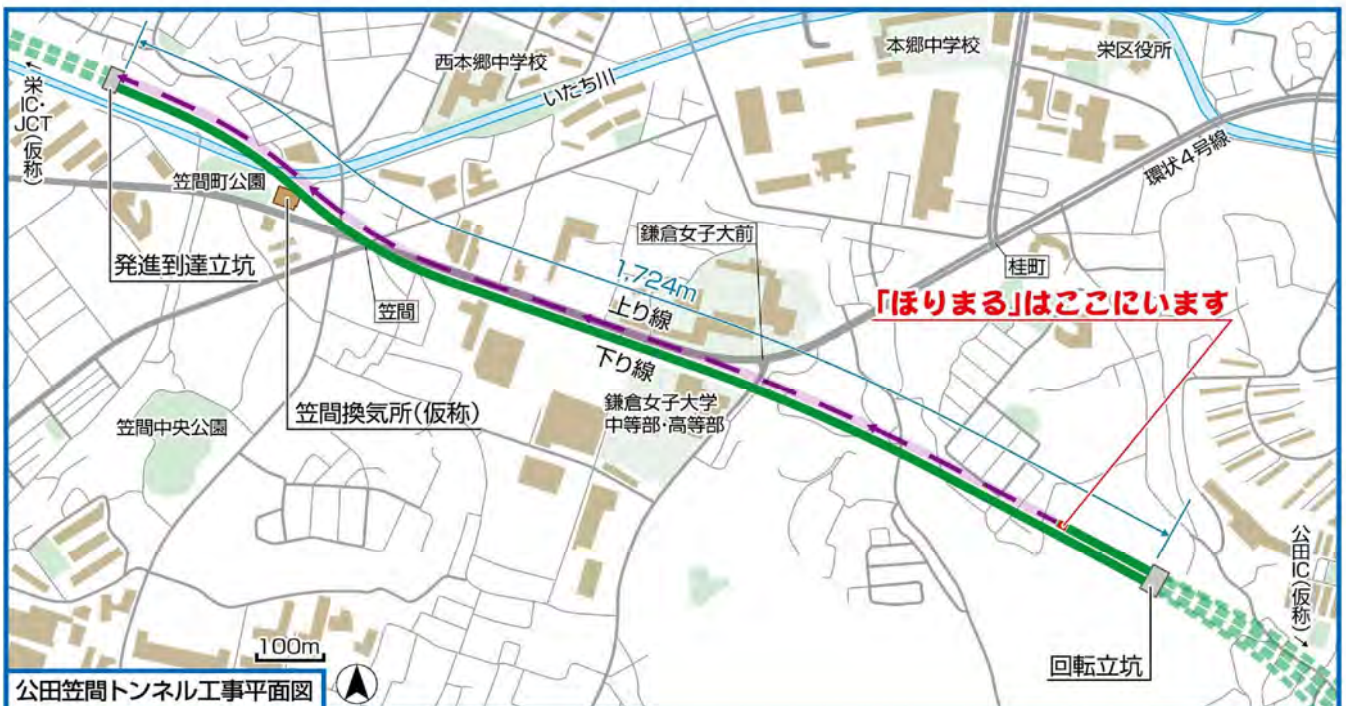

【連絡先】

発注者：東日本高速道路㈱ 関東支社 横浜工事事務所
岩瀬笠間工事区 工事長 村田 賢士 (公田笠間トンネル工事 担当)
TEL： 045-439-0180(代)

施工者：公田笠間トンネル工事
鹿島・竹中土木・佐藤工業JV
現場代理人 新川 健二 TEL： 045-443-9843
