

「横浜環状南線 公田笠間トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、7月から9月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

作業概要

【作業日】

平日及び祝日は通常作業、土曜・日曜日は原則休工


【作業時間】

地上部での作業：原則8時～17時


回転立坑内での作業：終日（夜間作業あり）

作業箇所


【工事箇所】

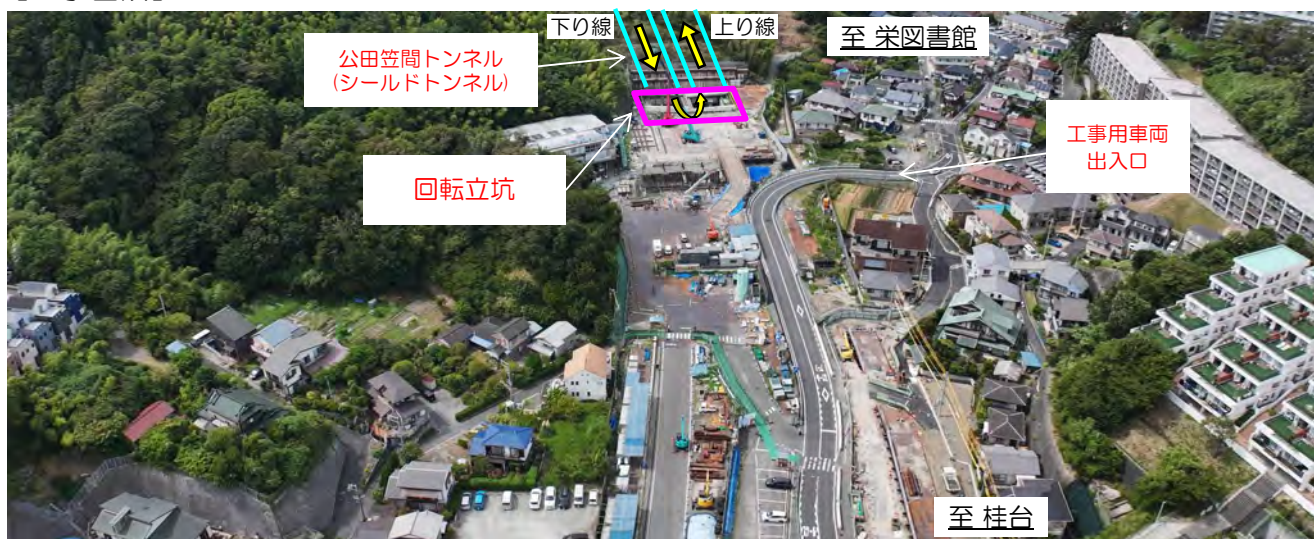

令和7年9月撮影

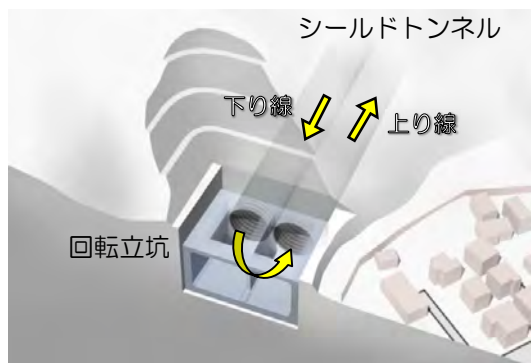


回転立坑イメージ

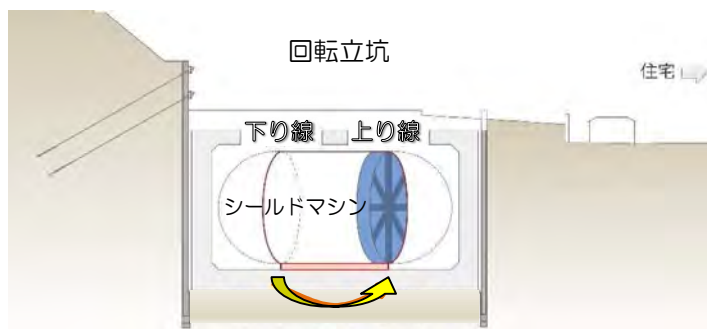

シールド機回転イメージ

作業箇所詳細図

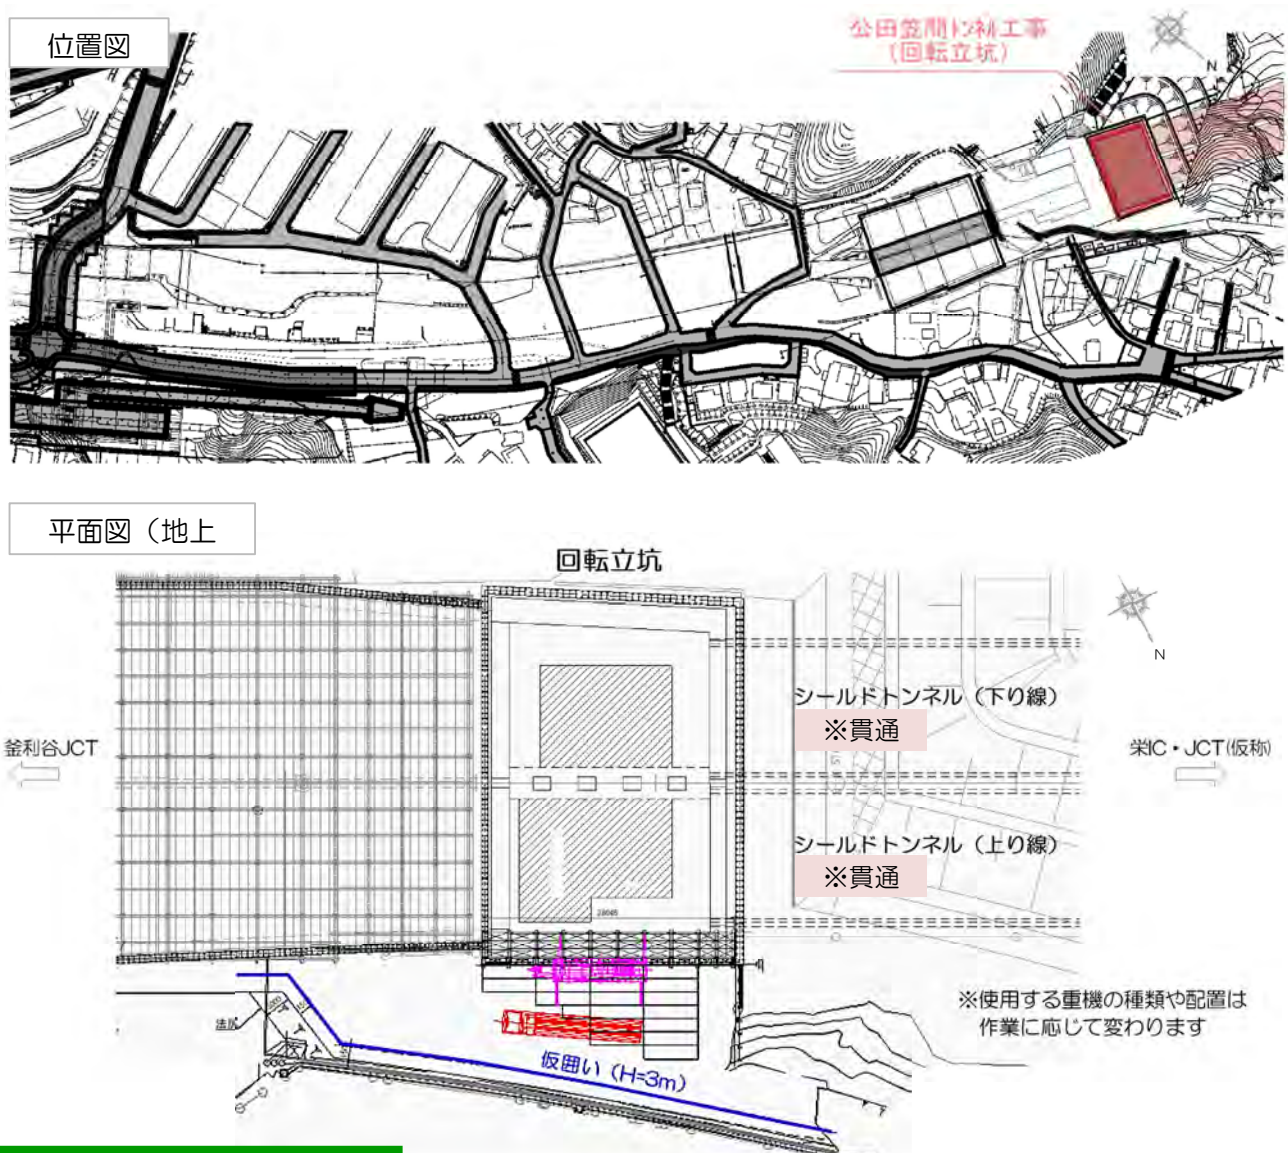

作業工程表と主な作業内容

作業内容	この先 3ヶ月の作業予定								
	7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①シールド設備解体工	設備解体搬出 (回転立坑から搬出)				お				
					盆				
②坑内内部構築工	内部構築 (回転立坑から搬出)				期				
					間				

①シールド設備解体工	シールド掘進に使用したトンネル内の設備 (ベルトコンベア、配管材など) を解体し、解体した部材を回転立坑から搬出します。
②坑内内部構築工	トンネル内のコンクリート構造物 (避難口合流部、貯水槽など) を構築します。 流動化処理土でトンネル内の路体部分の埋戻しを行います。

- ・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。
- ・21時以降は開閉式防音屋根を閉鎖した上で夜間作業を行います。
(地上クレーンは22時までにエンジンを停止します。)

工事進捗状況

【回転立坑】




全景写真（R8.6撮影）



回転立坑内の状況（R8.6撮影）



上り線坑内（R8.6撮影）

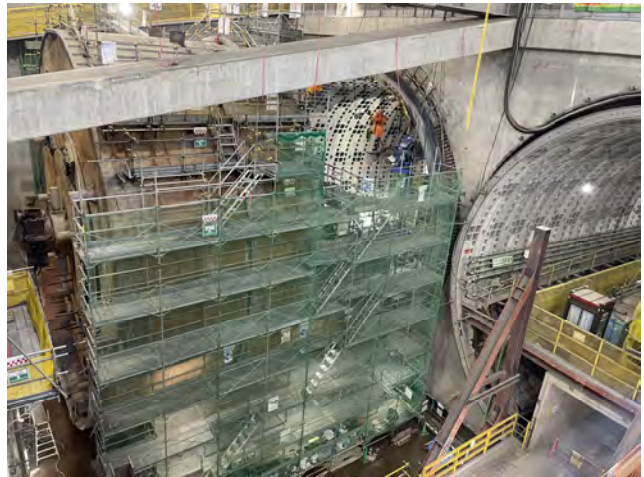

シールドマシン解体（R8.6撮影）

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
岩瀬笠間工事区 工事長 伊藤 潔（公田笠間トンネル工事 担当）
TEL：045-439-0180(代)
（平日9時～17時30分）

施工者：公田笠間トンネル工事
鹿島・竹中土木・佐藤工業JV
現場代理人 新川 健二 TEL：045-443-9843（24時間）
