令和2年8月5日

# 「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、8月から10月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。 工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますの で、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

#### 作 業 概 要

◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工 土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止

◆作業時間 原則 8 時~17 時 ※大型車両の通行は原則 9 時~17 時 シールド掘進及びベルコン土砂搬出については、夜間も実施予定


◆夏季休暇の期間

令和2年8月13日(木)~8月16日(日)は休工とします。

#### 作 業 箇 所



## 工事用道路

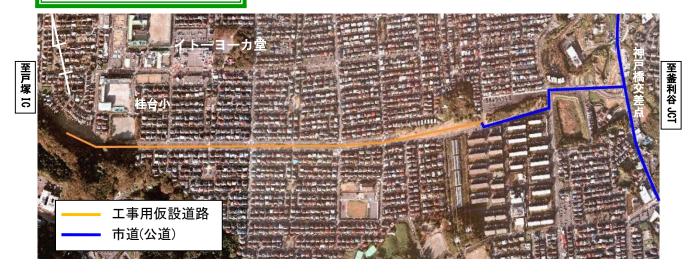

## 完成イメージ図


橋梁下部工部




土工部




**函渠部** 立坑部





シールドトンネル部





# 仮設物状況写真

防音ハウス設置状況



ベルトコンベア設置状況

#### 作業工程表

※天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

	この先3カ月の作業予定						
作業箇所	主な作業内容			<u></u> 月	9月		10月
橋梁下部工区	① 付替水路						
	② ベルコン整備						
	③ ベルコン稼働						
土工区	④ シールド設備						
函渠工区	⑤ 埋戻工						
発進立坑工区	⑥ 防音ハウス組立		夏				
	⑦ シールドマシン組立		季季				
	⑧ シールド設備		休				
	9 シールド 掘進工(初期掘進)		暇				
回転立坑工区	⑩ 躯体構築						
	⑪ シールド設備						
その他(釜利谷ヤード)	① 土砂仮置きヤード整備						
	③ ベルコン整備						
	14 ベルコン稼働・土砂積込・搬出						

- ①付替水路: P 4 橋脚、A 2 橋台付近の水路を新しく付替える工事です。
- ②ベルコン整備:トンネル掘削で出た土砂を搬出する設備を設置します。
- ③ベルコン稼働:トンネル掘削で出た土砂をベルコン設備で搬出します。
- 48①シールド設備:マシン後方に配置される設備等を組み立てます。
- ⑤埋戻工:躯体上に土砂を入れ、市道403付近の復旧を行う工事です。
- ⑥防音ハウス組立:発進立坑及び、その周辺に防音ハウスを設置する工事です。
- ⑦シールドマシン組立:トンネルを掘削するマシンを組み立てる工事です。
- ⑨シールド掘進工(初期掘進):トンネル掘削に必要な設備を整えながら掘進を行います。
- ⑩躯体構築:鉄筋を組立て、コンクリートを型枠に流し込み、回転立坑を構築する工事です。
- ②③④釜利谷ヤード:トンネル掘削した際の土砂を仮置きするヤードを整備します。
  - ※黄色着色部はシールド掘進関連の工程

#### 夏季休暇期間中の安全対策

- ①休工前は一斉点検を行います。
- ②工事箇所出入口の門扉は強固に固定し、施錠を行います。
- ③休工期間中は、協力会社が1名常駐し、2回/日の現場巡回点検を行います。
- ④巡回点検では、以下の確認を行います。
  - 1. 工事箇所出入口の施錠確認
  - 2. 仮囲いおよび門扉の異常の有無
  - 3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
  - 4. 現場休憩所の施錠確認
  - 5. 現場休憩所の異常の有無
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度 4 以上の地震発生時も協力会社が巡回点検を行い 異常の有無を確認します。

### 工事進捗状況

#### 写真撮影位置図



#### ■状況写真(7月27日撮影)









#### 【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所

上郷桂台工事区 工事長 棟方 貴史 配 045-439-0180 (代表)

施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)錢高組 JV

現場代理人 松村 英樹 ℡ 045-392-3985
