

## 「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、6月から8月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

### 作業概要

#### 【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工  
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


#### 【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時


### 作業箇所



### 工事用道路

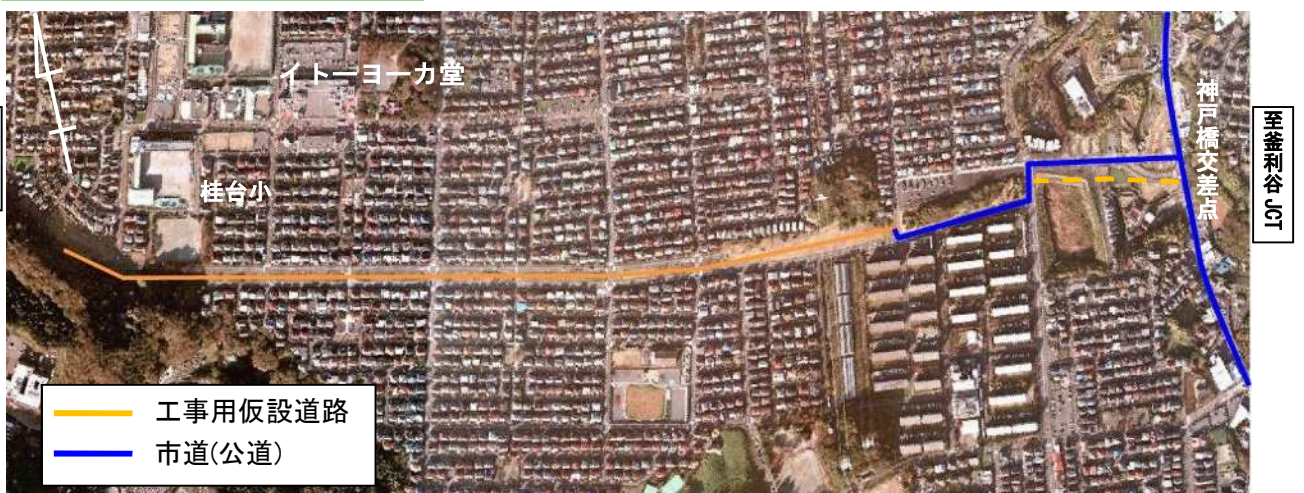


(橋梁下部工部)

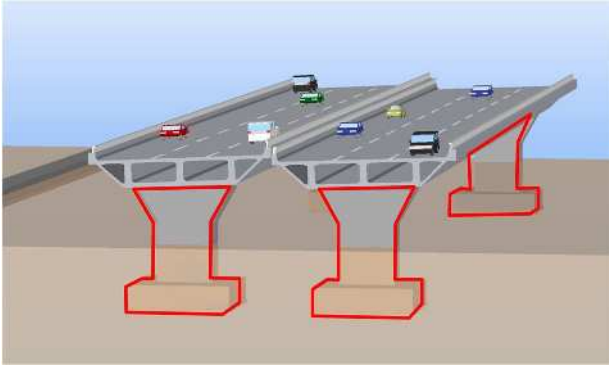


(土工部)




(函渠部)

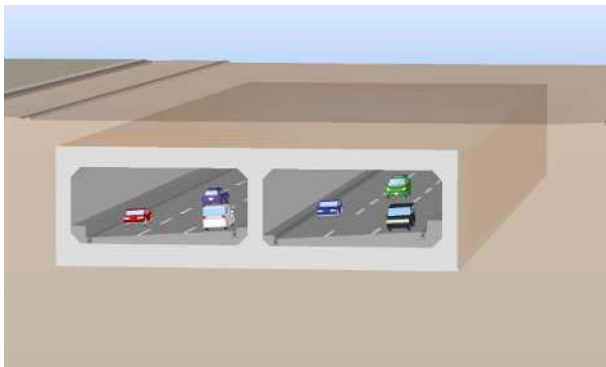

(立坑部)

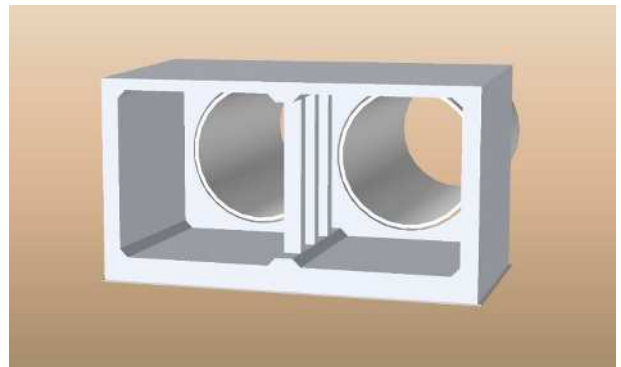

(シールドトンネル部)

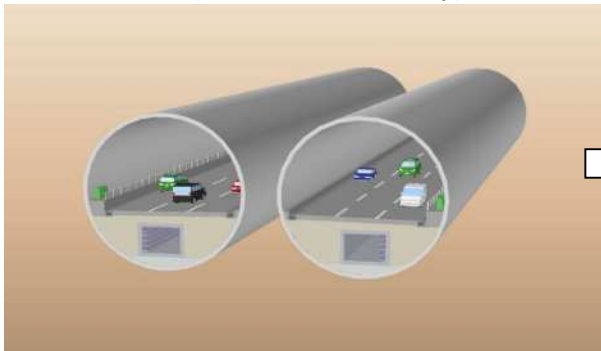

**仮設物状況写真**

防音ハウス設置状況



ベルトコンベア設置状況





## 作業工程表

※天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

作業箇所	主な作業内容	この先3カ月の作業予定		
		6月	7月	8月
橋梁下部工区	① 上部工施工			◆
				(環状4号夜間通行止め)
発進立坑工区	② シールド掘進工			
釜利谷工区	③ 土砂積込・搬出			
回転立坑工区	④ シールド設備工			
	⑤ のり面工			

①上部工施工：橋梁の橋桁や床版を構築します。

環状4号線の上部を工事する際には夜間通行止めを行います。

②シールド掘進工：トンネルの掘進を行います。

③土砂積込・搬出：仮置きしたトンネル掘削土砂の、積込及び搬出を行います。

④シールド設備工：回転立坑側へマシンが進入するための設備などを構築します。

⑤のり面工：回転立坑脇の切土のり面を構築するため掘削を行います。

## 工事進捗状況

写真撮影位置図



【シールド掘進工進捗状況】

令和4年5月23日現在

発進到達立坑から866m



## 工事進捗状況

写真撮影位置図



### ■状況写真(5月撮影)



### 【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所  
 上郷桂台工事区 工事長 山岸 大祐 TEL. 045-439-0180 (代表)

施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV  
 現場代理人 松村 英樹 TEL. 045-392-3985
