

「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、5月から7月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

【大型連休期間（4月29日～5月8日）】


平成28年5月1日～平成28年5月5日までと5月8日は休工します。

作業箇所

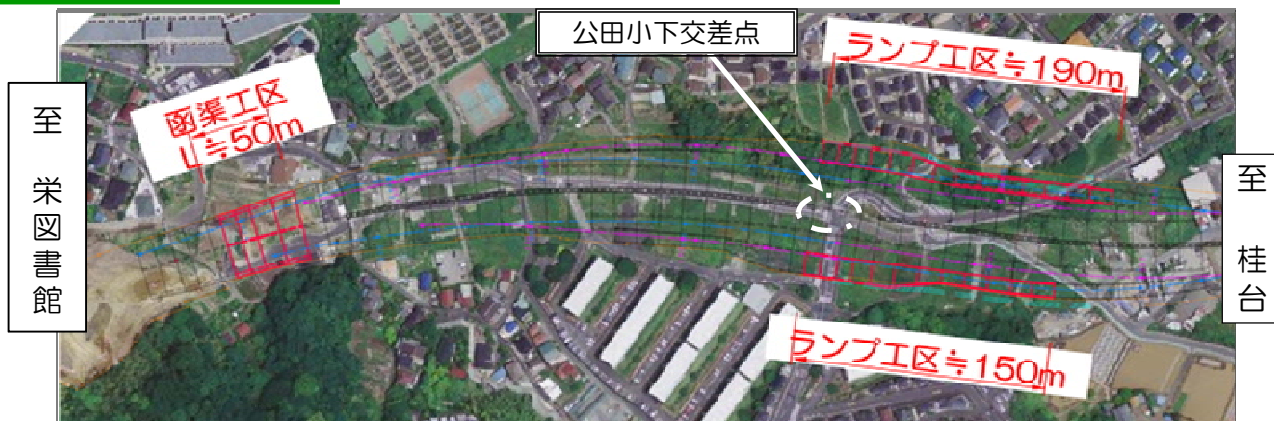


この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

函渠工区

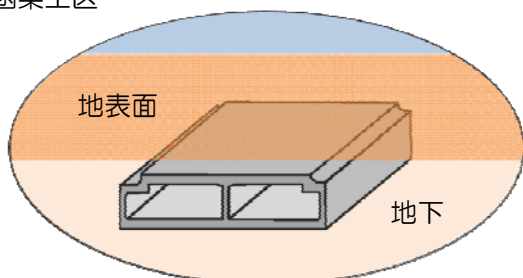


ランプ工区

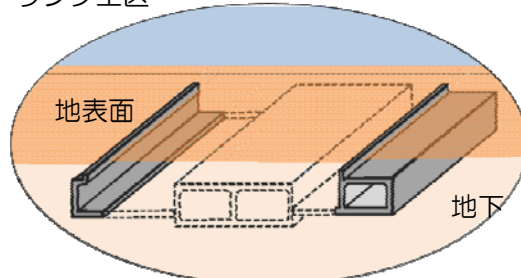

※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

公田町付近の主な工事について

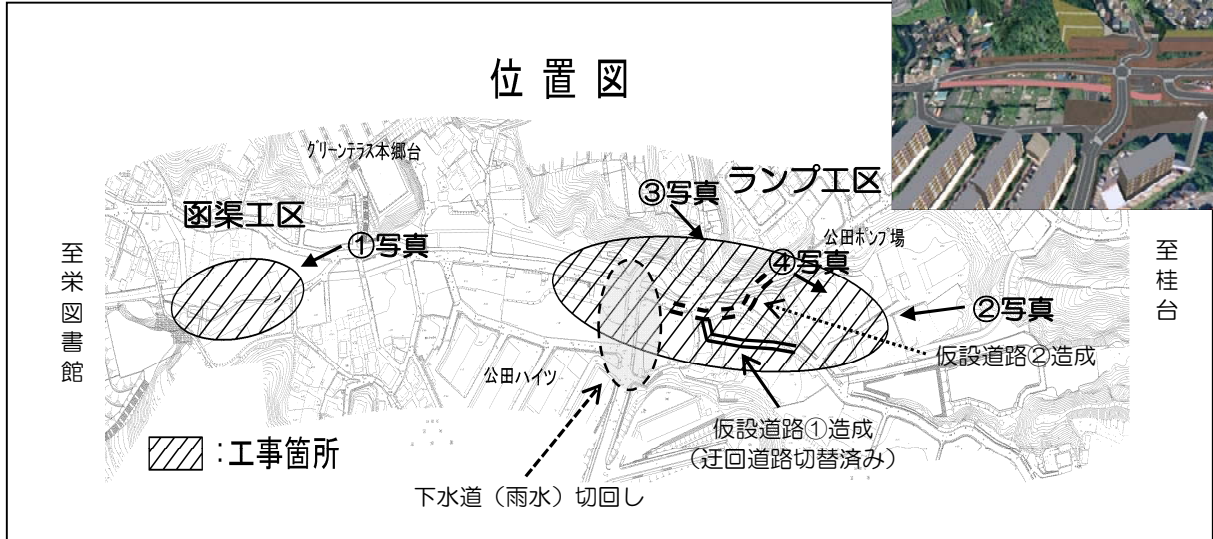

【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所		この先3ヶ月の作業予定			
		主な作業内容	5月	6月	7月
函渠工区		① 地下水対策工			
ランプ工区	公田ポンプ場周辺 荒井沢川周辺	② 仮設道路①造成	迂回道路切替済み	←	★2回目の切替
		③ 仮設道路②造成			←
		④ 迂回道路(仮栈橋道路)			
		⑤ 荒井沢川覆工	←	→	
		⑥ 下水道(雨水)切り回し			←
	山側斜面周辺	④ 迂回道路(仮栈橋道路)		←	
		⑦ 切土工	→		
		⑧ 仮設栈橋工(工専用通路)		←	


- ① 地下水対策工 : 地下構造物を造る際に周辺の地下水を低下させないよう、地盤の中に水を注入する設備を造ります。
- ② 仮設道路①造成 : 荒井沢へ向かう迂回道路の道路線形を変えるため造成します。
- ③ 仮設道路②造成 : 現在のポンプ場前の道路を迂回させるため、新たな道路を造成します。
- ④ 迂回道路(仮栈橋道路) : 公田小下交差点周辺を中心とした迂回道路(仮栈橋道路)を造るため、杭を打設して鋼材を組み立てます。
- ⑤ 荒井沢川覆工 : 仮設道路②造成を造成するため、荒井沢川に蓋を掛け、その上に盛土します。
- ⑥ 下水道(雨水)切り回し : 公田小学校から下る道路に埋設された直径1.5mの下水道(雨水管)を別の位置に迂回させます。
- ⑦ 切土工 : 公田小下交差点周辺の斜面を掘削します。
- ⑧ 仮設栈橋工(工専用通路) : 杭を打設して鋼材を組み立て、工事用の通路とする仮設栈橋(斜路)を造ります。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

【工事進捗状況】



桂台付近の主な工事について

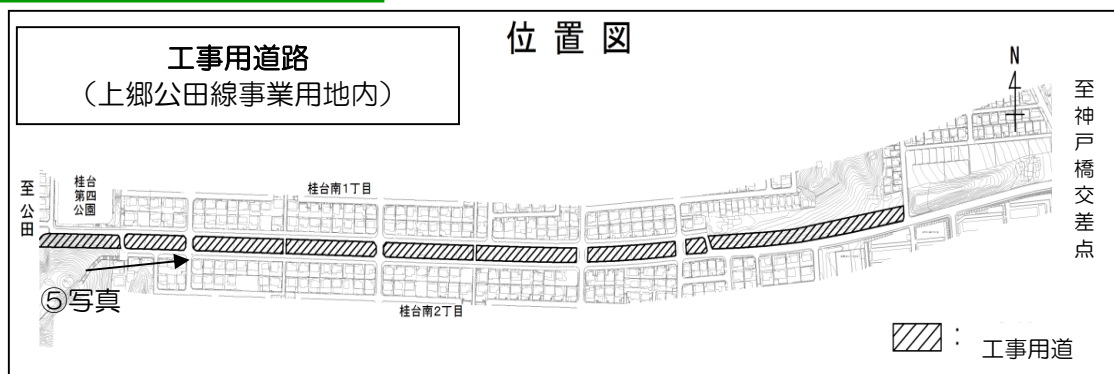

工事用道路が完成し、H28.3.23より大型車両の通行を開始しました。

【状況写真】



大型連休期間中の安全対策について

- ①大型連休前までに一斉点検を実施します。
- ②工事箇所出入口部及び工事用道路出入口部の門扉は強固に固定し施錠いたします。
- ③休工期間中は定期巡回点検を実施します。（朝と夕方、警備員による巡回）
- ④巡回点検時には遮へい板の異常の有無や出入口ゲートの施錠を中心に確認いたします。
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時にも巡回点検を行い異常の有無を確認します。

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 池田 英明（公田地区掘割試験工事 担当）
TEL. 045-352-3771（代表）

施工者：公田地区掘割試験工事
(株)大林組
現場代理人 小山 浩史 TEL. 045-435-5809
