

「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、7月から9月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

【夏季休暇の期間】


平成28年8月14日～平成28年8月21日までです。

作業箇所

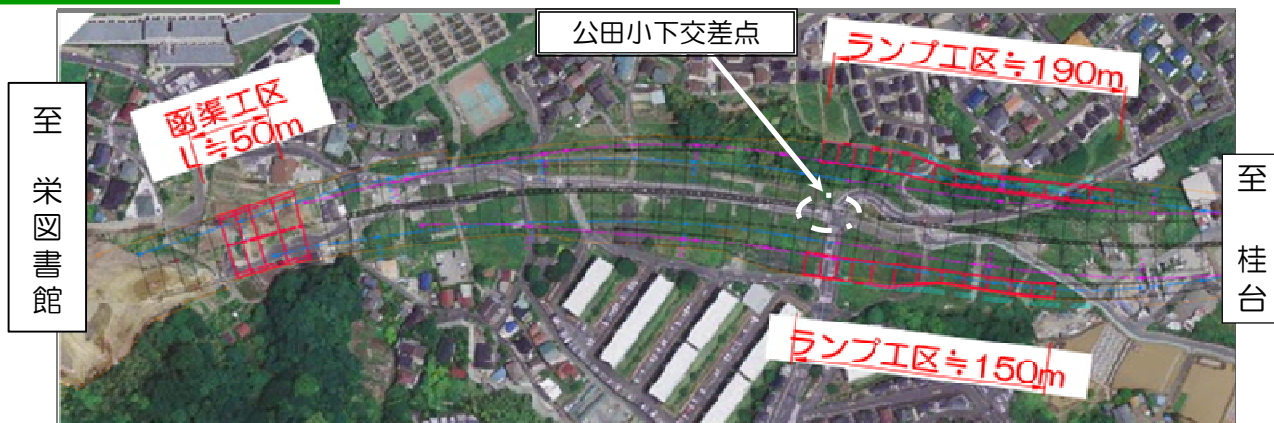


この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

函渠工区

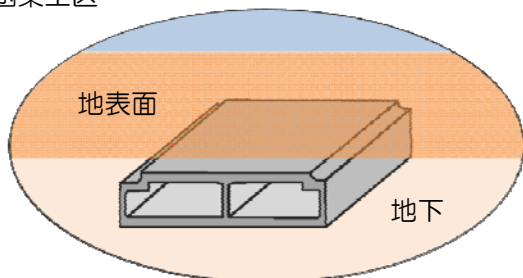


ランプ工区

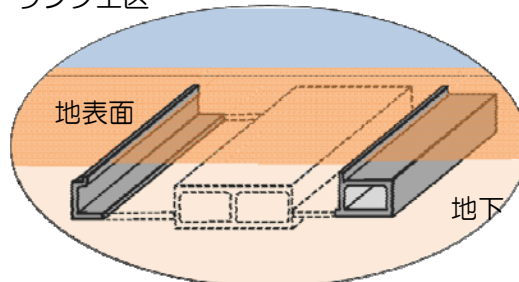

※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

公田町付近の主な工事について

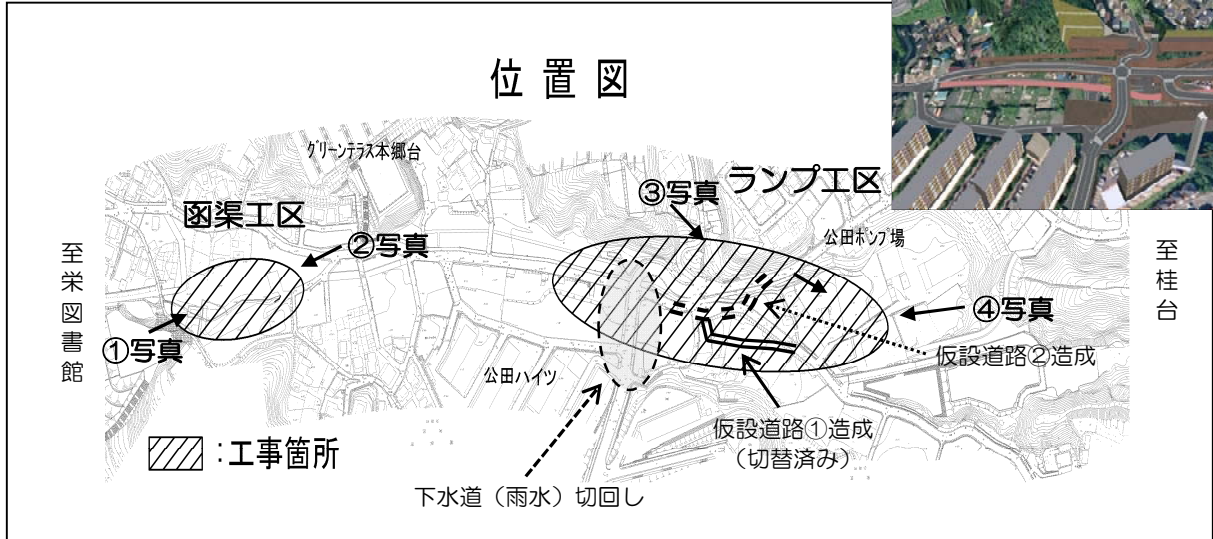

【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所	主な作業内容	この先3ヶ月の作業予定		
		7月	8月	9月
函渠工区	① 地下水対策工			→
ランプ工区	② 迂回道路(仮栈橋道路)			
	③ 仮設道路①造成	4/19 1回目の切替	→ 2回目の切替	
	④ 仮設道路②造成		←	→ 切替
	⑤ 下水道(雨水)切り回し		←	→
	⑥ 仮設栈橋工(工事用通路)			→
山側斜面周辺	⑦ 切土工			←
	⑧ グリーンテラス前伐採工	←	→	

- ① 地下水対策工 : 地下構造物を造る際に周辺の地下水を低下させないよう、地盤の中に水を注入する設備を造ります。
- ② 迂回道路(仮栈橋道路) : 公田小下交差点周辺を中心とした迂回道路(仮栈橋道路)を造るため、杭を打設して鋼材を組み立てます。
- ③ 仮設道路①造成 : 荒井沢へ向かう道路(迂回路)の道路線形を変えるため造成します。
- ④ 仮設道路②造成 : 迂回道路(仮栈橋道路)設置のために、現在のポンプ場前の道路の脇へ新たに迂回路を造成します。
- ⑤ 下水道(雨水)切り回し : 公田小学校から下る道路に埋設された直径1.5mの下水道(雨水管)を別の位置に迂回させます。
- ⑥ 仮設栈橋工(工事用通路) : 杭を打設して鋼材を組み立て、工事用の通路とする仮設栈橋(斜路)を造ります。
- ⑦ 切土工 : 公田小下交差点周辺の斜面を掘削します。
- ⑧ グリーンテラス前伐採工 : グリーンテラス本郷台階段部周辺の高木を伐採します。工事の間、一時的に駐輪場を移設します。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。



工事期間中の安全対策について

- ①子供などが工事ヤード内に容易に入れないよう仮囲い及び門扉を設置します。
- ②仮囲い隅角部はクリアパネル又は隅切りを行い見通しを確保します。
- ③仮囲いの異常の有無を巡回点検にて確認します。
- ④車両の出入がある時は一般道との交差部にガードマンを配置し、車両の誘導を行います。
- ⑤ガードマンは歩行者、一般車両を最優先とした車両の誘導を行います。
- ⑥車両出入りロゲートに出入口表示看板を設置します。
- ⑦一般車と工事関係車両の区別をするため、工事用車両プレートで表示します。
- ⑧工事用道路の通行は 15km/hで走行します。
- ⑨ダンプの荷台はシートにより、軽量・小型資機材等の飛散防止対策を行います。

夏季休暇期間中の安全対策について

- ①夏季休暇前までに一斉点検を実施します。
- ②工事箇所出入口部及び工事用道路出入口部の門扉は強固に固定し施錠いたします。
- ③休工期間中は定期巡回点検を実施します。（朝と夕方、警備員による巡回）
- ④巡回点検時には遮へい板の異常の有無や出入口ゲートの施錠を中心に確認いたします。
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時にも巡回点検を行い異常の有無を確認します。

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 池田 英明（公田地区掘割試験工事 担当）
TEL. 045-352-3771（代表）

施工者：公田地区掘割試験工事
(株)大林組
現場代理人 小山 浩史 TEL. 045-435-5809
