

# 「横浜環状南線 公田笠間トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、9月から11月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。


## 作業概要

- 【作業日】  
平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工  
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- 【作業時間】  
原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時


## 作業箇所



地理院地図(国土地理院) (<https://www.gsi.go.jp>) をもとに、東日本高速道路㈱が加工

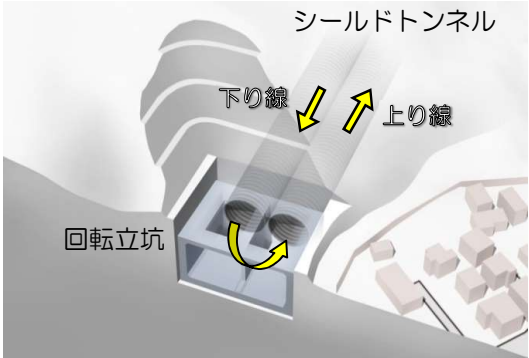


回転立坑イメージ

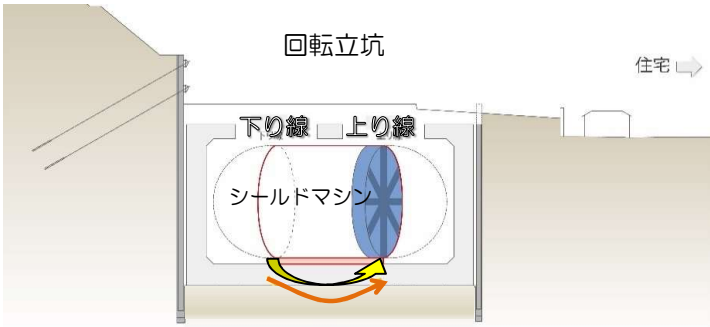

シールドマシン回転イメージ

## 作業箇所詳細図

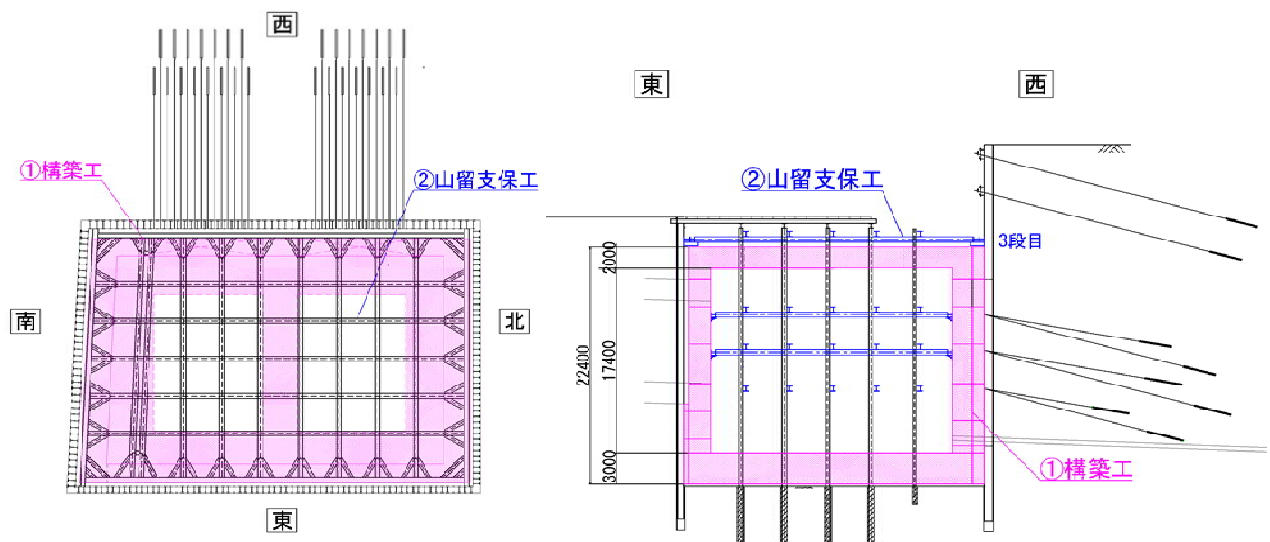

## 作業工程表と主な作業内容

【作業工程表及び主な作業内容】

作業内容	この先 3ヶ月の作業予定								
	9月			10月			11月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
① 構築工	型枠解体			足場解体					
② 山留支保工	3段目撤去							盛替梁撤去	

① 構築工	鉄筋コンクリートにより立坑を構築します。
② 山留支保工	山留め壁(等厚式連続壁)を保持するために施工した支保工を、順次撤去します。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

## 工事進捗状況

### 【回転立坑】



全景写真(R4.7.9撮影)



立坑内写真(R4.7.9撮影)

### 【シールド掘進進捗状況】

令和4年8月15日現在

発進到達立坑から148m

※現在、掘進に必要な設備を整える作業を行っています。設備が整い次第、8月中旬に掘進を再開する予定です。

※工事の状況により、進捗予定が変更となる場合があります。



### 【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所  
岩瀬笠間工事区 工事長 村田 賢士 (公田笠間トンネル工事 担当)  
TEL. 045-439-0180(代)

施工者：公田笠間トンネル工事  
鹿島・竹中土木・佐藤工業JV  
現場代理人 柴田 佳彦 TEL. 045-443-9843
