

「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、5月から7月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。


作業概要

- ◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- ◆作業時間 原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時
※シールド掘進及びバルコン土砂搬出については、夜間も実施します
- ◆大型連休の期間
令和3年5月1日（土）～令和3年5月9日（日）は休工とします。

作業箇所




工事用道路

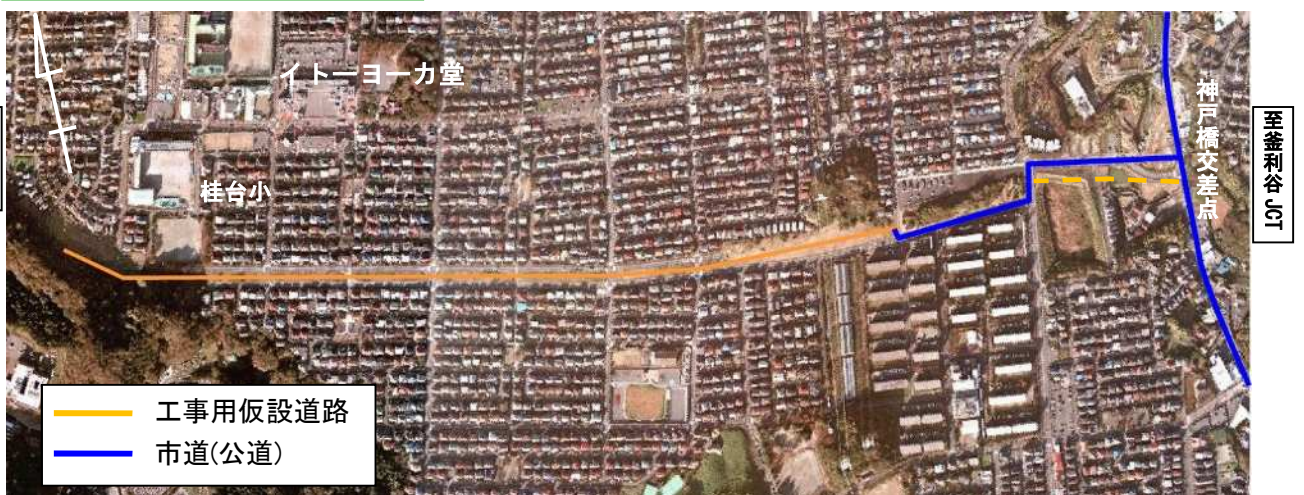

完成イメージ図


橋梁下部工部

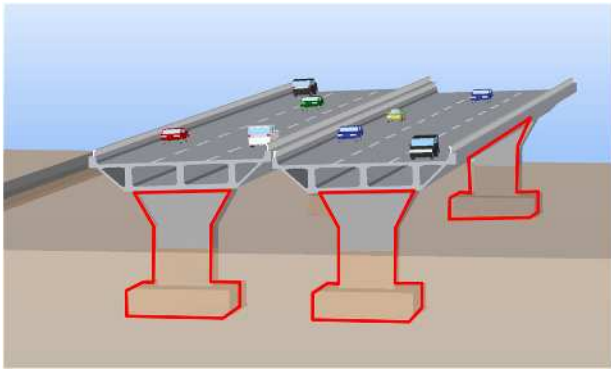


土工部




函渠部

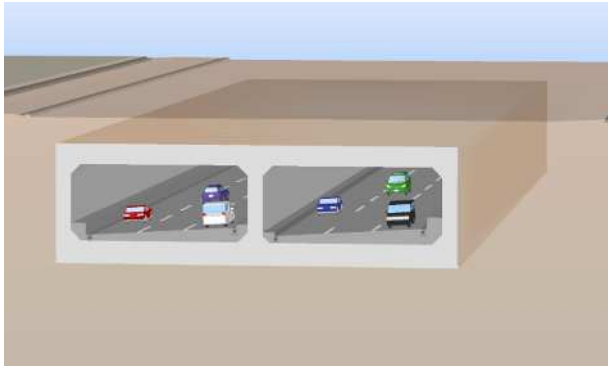

立坑部

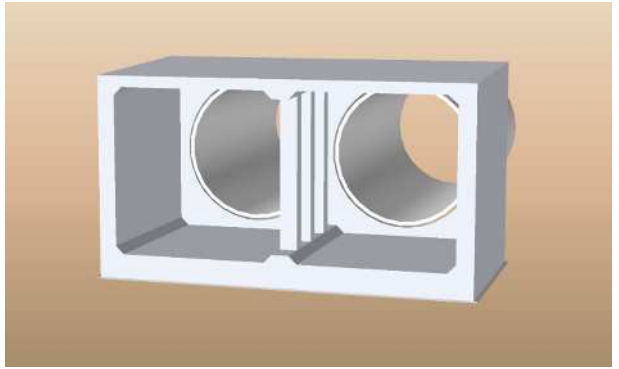

シールドトンネル部

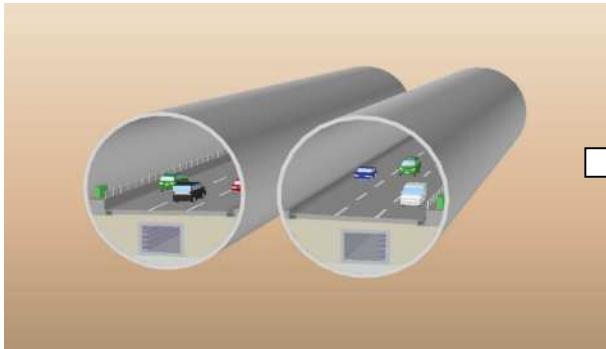

シールドマシン（工場仮組時）

仮設物状況写真

防音ハウス設置状況



ベルトコンベア設置状況



作業工程表

※天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

作業箇所	この先3カ月の作業予定			
	主な作業内容	5月	6月	7月
橋梁下部工区	① 付替道路			
発進立坑工区	② シールド段取替工			
	③ シールド掘進工			
回転立坑工区	④ シールド設備工			
	⑤ ネット設置工			
	⑥ 伐採工			
	⑦ のり面工			
釜利谷工区	⑧ 土砂積込・搬出			

- ①付替道路：市道406号道路の付替えに伴う整備工事です。
- ②シールド段取替工：本掘進に必要な設備を構築します。
- ③シールド掘進工(本掘進)：トンネルの掘進を行います。
- ④シールド設備工：回転立坑側へマシンが進入するための設備を構築します。
- ⑤ネット設置工：のり面工を行うための保護ネットを設置します。
- ⑥伐採工：のり面工を行う前の樹木伐採等を行います。
- ⑦のり面工：回転立坑脇の切土のり面を構築するため掘削を行います。
- ⑧土砂積込・搬出：釜利谷ヤードに仮置きしたトンネル掘削土砂の、積込及び搬出を行います。

大型連休期間中の安全対策


- ①休工前は一斉点検を行います。
- ②工事箇所出入口の門扉は強固に固定し、施錠を行います。
- ③休工期間中は、協力会社が1名常駐し、2回/日の現場巡回点検を行います。
- ④巡回点検では、以下の確認を行います。
1. 工事箇所出入口の施錠確認
 2. 仮囲いおよび門扉の異常の有無
 3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
 4. 現場休憩所の施錠確認
 5. 現場休憩所の異常の有無
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時も協力会社が巡回点検を行い異常の有無を確認します。

工事進捗状況

写真撮影位置図



■状況写真(4月13日撮影)

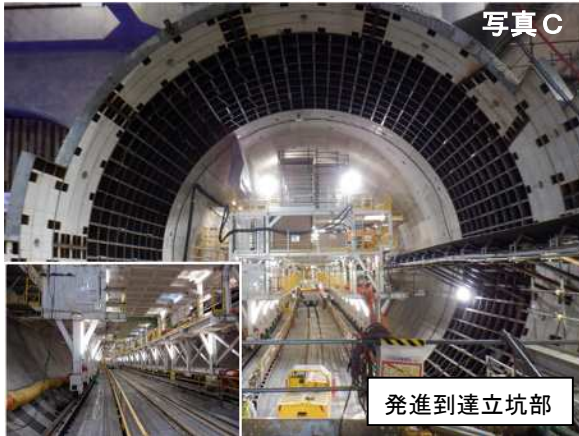

【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所
 上郷桂台工事区 工事長 棟方 貴史 TEL. 045-439-0180 (代表)

施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV
 現場代理人 松村 英樹 TEL. 045-392-3985
