

「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、8月から10月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。


作業概要

- ◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- ◆作業時間 原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時
※連休（お盆休み）の期間は設けず上記により作業を行います

作業箇所




工所用道路

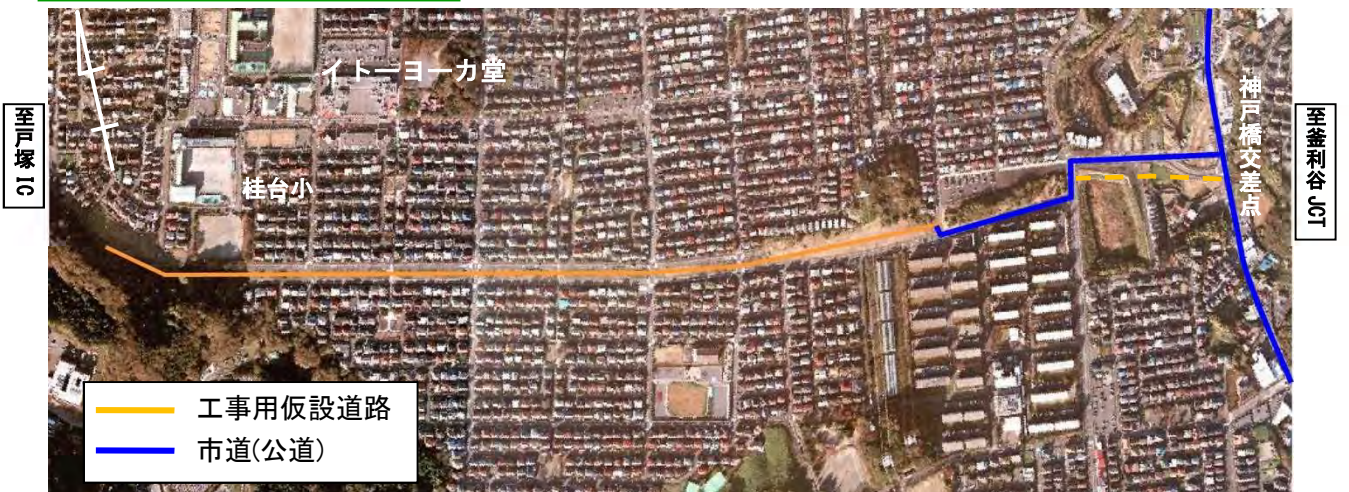


完成イメージ図


橋梁下部工部

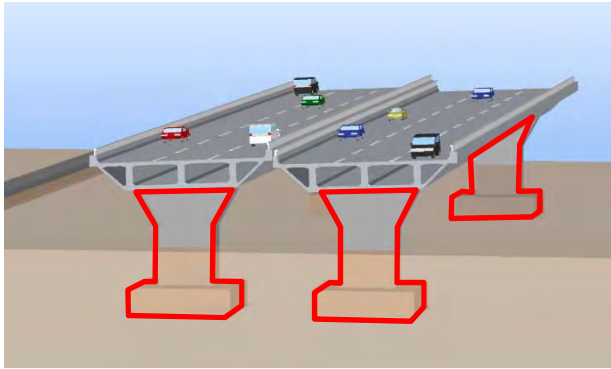


土工部

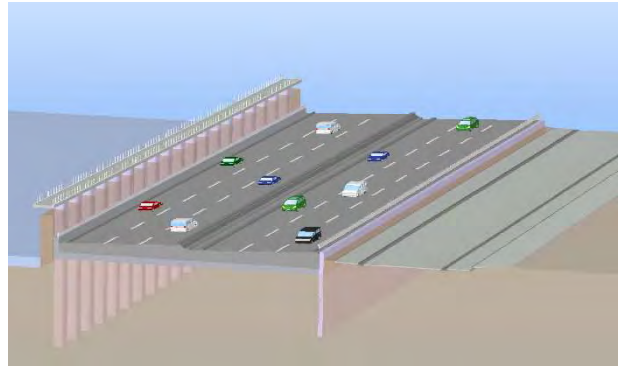


函渠部

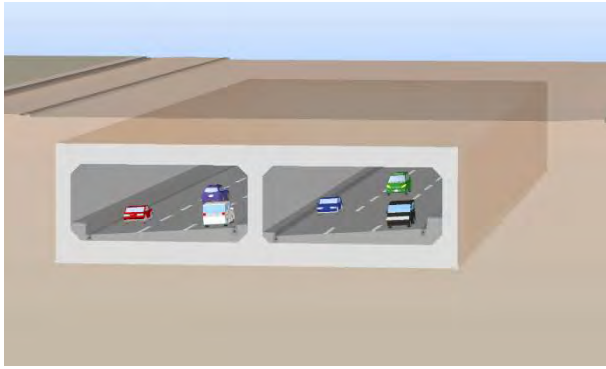

立坑部

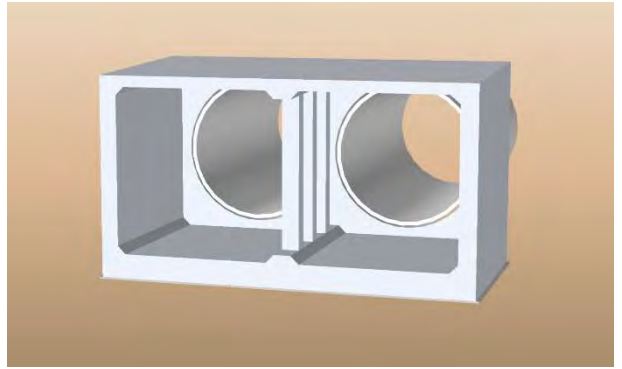

シールドトンネル部

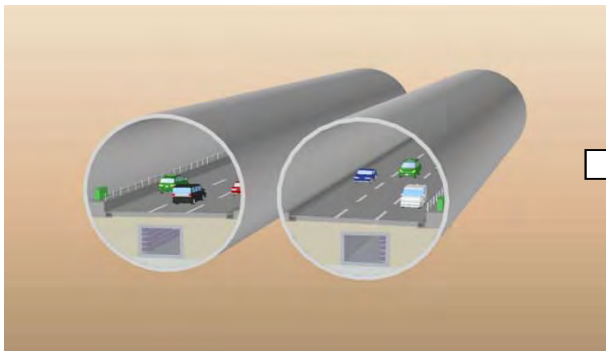

仮設物状況写真

防音ハウス設置状況



ベルトコンベア設置状況



作業工程表

※天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

作業箇所	この先3カ月の作業予定			
	主な作業内容	8月	9月	10月
橋梁下部工区	① 付替道路			
回転立坑工区	② シールド設備工			
	③ のり面工			

①付替道路：市道406号道路の付替えに伴う整備工事です。

②シールド設備工：回転立坑側へマシンが進入するための設備などを構築します。

③のり面工：回転立坑脇の切土のり面を構築するため掘削を行います。

※シールドマシンによる掘進については、シールドマシンの前面のカッター（円盤）を回転させるためのモーターが故障したことから、現在、掘進を一時停止し、点検と部品交換を実施しています。

現在のところ、部品の調達に要する期間が定かではないため停止する期間については未定です。部品の交換等に要する期間などの詳細が分かり次第、お知らせします。

休日期間中の安全対策

①休工前は一斉点検を行います。

②工事箇所出入口の門扉は強固に固定し、施錠を行います。

③休工期間中は、協力会社が1名常駐し、2回/日の現場巡回点検を行います。

④巡回点検では、以下の確認を行います。

1. 工事箇所出入口の施錠確認
2. 仮囲いおよび門扉の異常の有無
3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
4. 現場休憩所の施錠確認
5. 現場休憩所の異常の有無

⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時も協力会社が巡回点検を行い異常の有無を確認します。

工事進捗状況

写真撮影位置図



■状況写真(7月28日撮影)



【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所
 上郷桂台工事区 工事長 山岸 大祐 TEL. 045-439-0180 (代表)
 施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV
 現場代理人 松村 英樹 TEL. 045-392-3985
