

「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、7月から9月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

【夏季休暇の期間】


平成29年8月13日～8月16日は休工とします

作業箇所

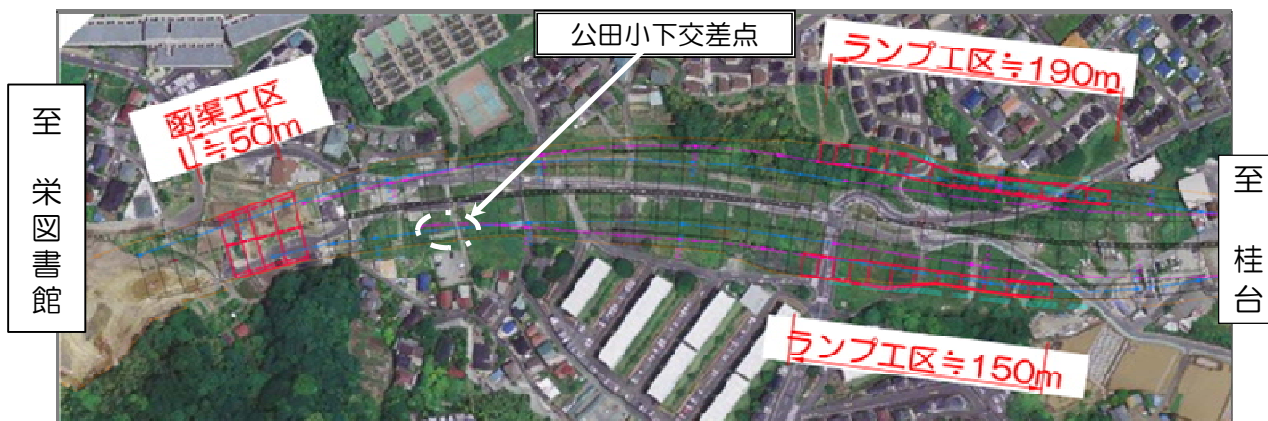


この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

函渠工区

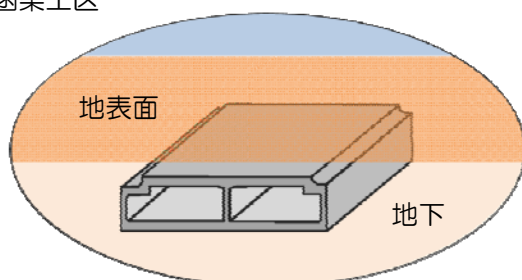


ランプ工区

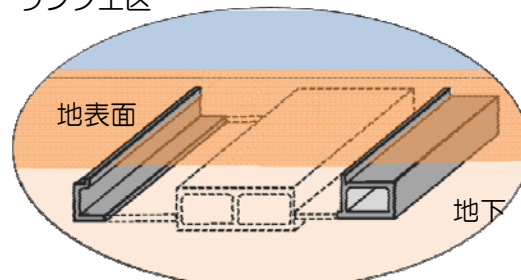

※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

公田町付近の主な工事について

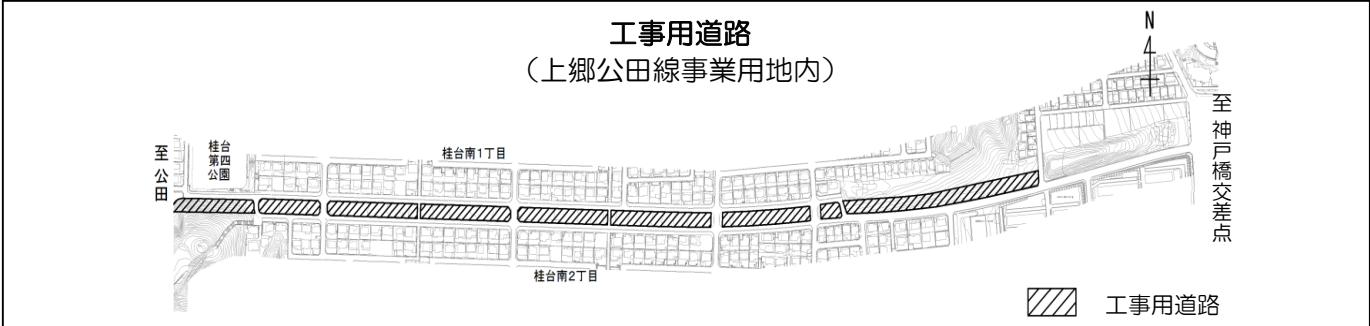


【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所	この先3ヶ月の作業予定				
	主な作業内容	7月	8月	9月	
工事用道路	① 桂台工事用道路	[Progress bar]			
ランプ工区	② 仮設道路による迂回路	迂回道路供用予定日検討中			
	③ 土留工	鋼矢板圧入			
	山側斜面周辺	④ 迂回道路(仮栈橋道路)	迂回道路供用予定日検討中		
		⑤ 仮設栈橋工(工事用道路)	[Progress bar]		
		③ 土留工	鋼矢板・鋼管杭圧入		
		⑥ 下水道切り回し	通行止め(10時～16時) 7月下旬～8月上旬に予定		通行止め(10時～16時) 9月以降11回程度あり
	⑦ 切土工	[Progress bar]			
公田ハイツ周辺	⑥ 下水道切り回し	[Progress bar]			
函渠工区	⑧ 掘削工	[Progress bar]			
	⑨ 構築工	[Progress bar]			

- ① 桂台工事用道路 : 桂台工事用道路の維持管理を行います。
- ② 仮設道路による迂回路 : 迂回道路(仮栈橋道路)設置のために、ポンプ場前の道路を迂回しています。(仮栈橋道路切替まで)
- ③ 土留工 : 構造物を構築するための掘削を行う際に、土留めとなる鋼矢板及び鋼管杭を圧入します。
- ④ 迂回道路(仮栈橋道路) : 公田小学校下交差点周辺の迂回道路(仮栈橋道路)を造るため、鋼材を組み立て、舗装、ガードレール・信号・街路灯等を設置します。
- ⑤ 仮設栈橋工(工事用道路) : 杭を打設して鋼材を組み立て、工事用の通路とする仮設栈橋を造ります。
- ⑥ 下水道切り回し : 道路に埋設された下水道を、別の位置に迂回します。
- ⑦ 切土工 : 公田小下交差点周辺の斜面の立木伐採、斜面の掘削を行います。
- ⑧ 掘削工 : 構造物を地中に設置するために地面を掘削します。(7月下旬掘削完了)
- ⑨ 構築工 : 鉄筋コンクリートにより、ボックスカルバートを構築します。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

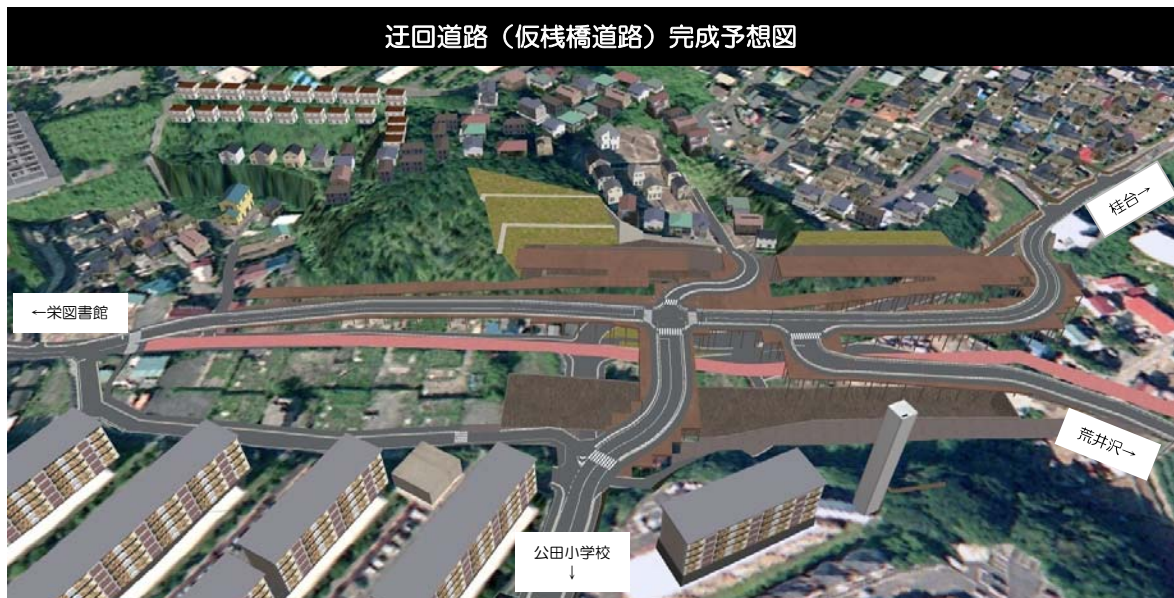

I 函渠工区 掘削状況



II 函渠工区 施工状況



III ランプ工区 Aランプ 土留工施工状況



IV ランプ工区 Aランプ 土留工施工状況



夏季休暇期間中の安全対策について

- ①夏季休暇前までに一斉点検を実施します。
- ②工事箇所出入口部及び工事用道路出入口部の門扉は強固に固定し施錠いたします。
- ③休工期間中は定期巡回点検を実施します。（朝と夕方、警備員による巡回）
- ④巡回点検時には遮へい板の異常の有無や出入口ゲートの施錠を中心に確認いたします。
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時にも巡回点検を行い異常の有無を確認します。

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 八幡 一夫（公田地区掘割試験工事 担当）
TEL. 045-352-3771（代表）

施工者：公田地区掘割試験工事
(株)大林組
現場代理人 飯谷 隆 TEL. 045-435-5809
