

「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、8月から10月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

【夏季休暇の期間】


平成30年8月12日から8月16日は休工とします

作業箇所

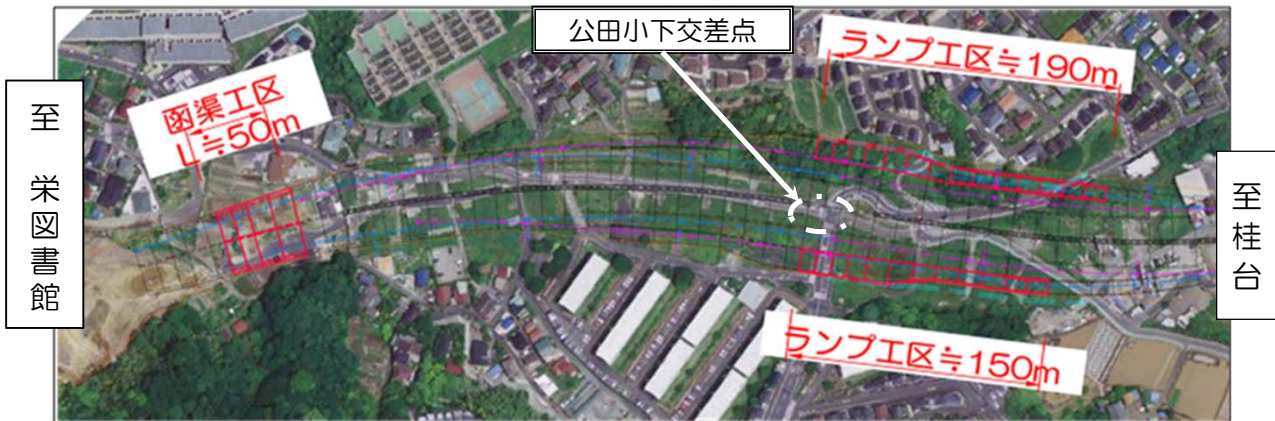


この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

函渠工区


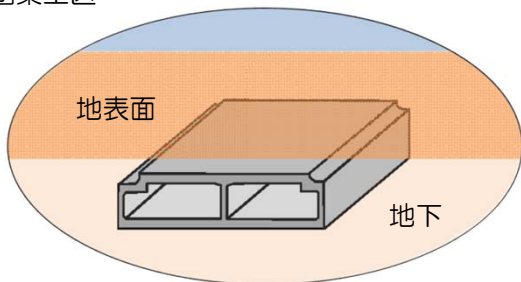


ランプ工区

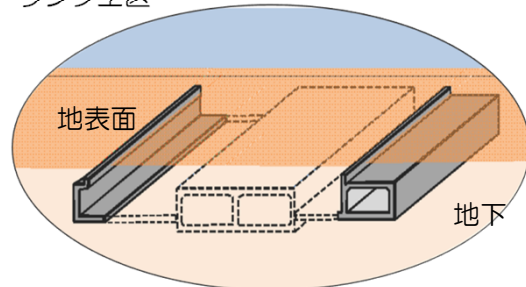

※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

公田町付近の主な工事について

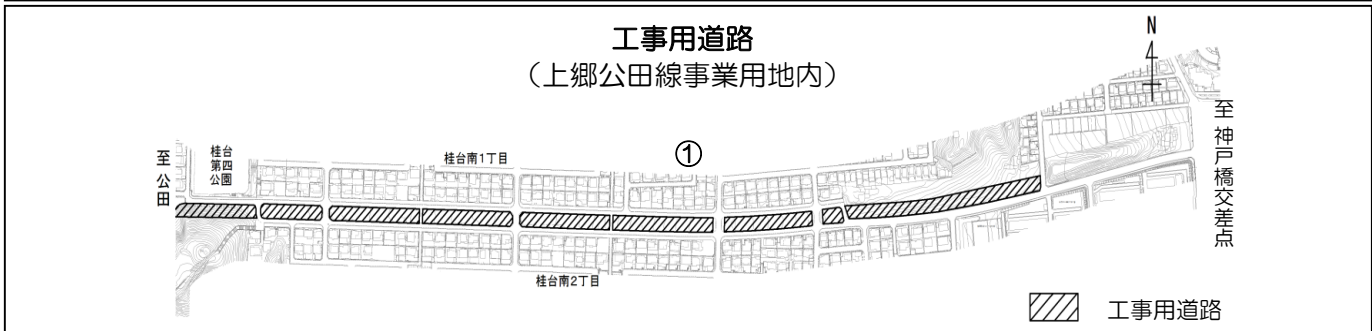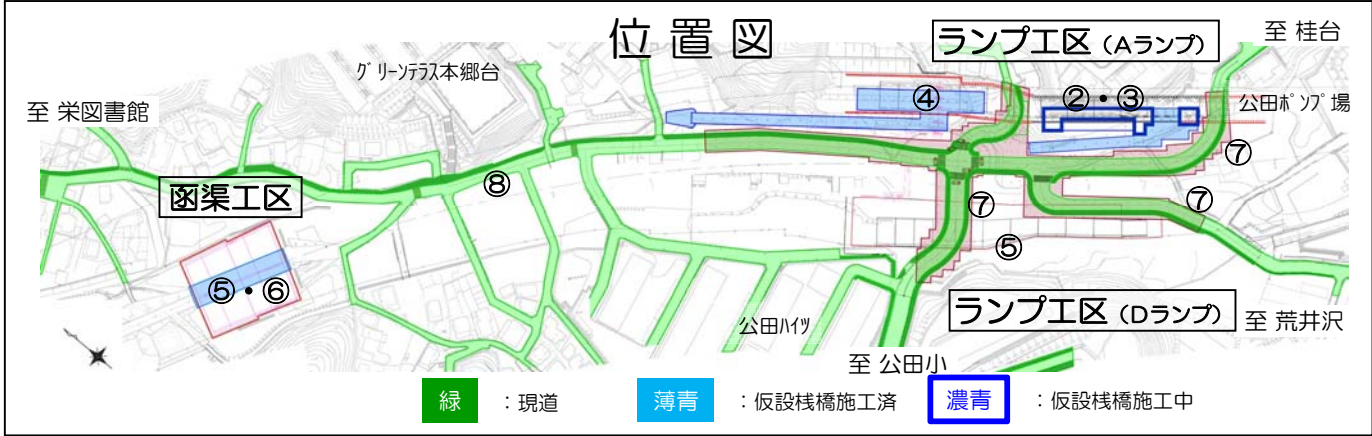

【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所		この先3ヶ月の作業予定			
		主な作業内容	8月	9月	10月
工事用道路		① 桂台工事用道路	[Progress bar from start to end]		
ランプ工区	Aランプ [山側斜面周辺 公田ポンプ場周辺]	② 仮設栈橋工(工事用道路)	[Progress bar from start to end]		
		③ 土留工	[Progress bar from start to end]		
	④ 掘削工	[Progress bar from start to end]			
	Dランプ [公田ハイッ周辺 荒井沢川周辺]	⑤ 構築工	[Progress bar from start to end]		
その他 [公田ポンプ場~荒井沢川 ~公田ハイッ周辺]		⑦ 水道切り回し準備	[Progress bar from start to end]		
函渠工区		⑤ 構築工	[Progress bar from start to end]		
		⑥ 埋戻し工	[Progress bar from start to end]		
その他		⑧ 道路移設	[Progress bar from start to end]		

- ① 桂台工事用道路 : 桂台工事用道路の維持管理を行います。
- ② 仮設栈橋工(工事用道路) : 杭を設置して鋼材を組み立て、工事用の通路とする仮設栈橋を造ります。
- ③ 土留工 : 構造物を構築するための掘削を行う際に、土留めとなる鋼管杭を圧入します。
- ④ 掘削工 : 構造物を地中に設置するために、鋼材により支えながら、地面を掘削します。
- ⑤ 構築工 : 鉄筋コンクリートにより、ボックスカルバートやL型の構造物を構築します。
- ⑥ 埋戻し工 : 地中に構造物ができた箇所から埋戻しを行い、鋼材の支えを撤去します。
- ⑦ 水道切り回し準備 : 水道管を迂回道路(仮栈橋道路)に取り付けるため、鋼材の受台を設置します。
- ⑧ 道路移設 : 市道桂町24号線を移設するため、支障物の撤去や造成、舗装を行います。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

工事進捗状況



【進捗状況写真】

平成30年7月30日撮影

I 函渠工区 コンクリート施工状況



II ランプ工区 (Aランプ終点側) 掘削施工状況



III ランプ工区 (Aランプ起点側) 仮設栈橋施工状況



IV ランプ工区 (Dランプ) 底版コンクリート施工状況



夏季休暇期間中の安全対策について

- ①夏季休暇前までに一斉点検を実施します。
- ②工事箇所出入口部及び工事用道路出入口部の門扉は強固に固定し施錠します。
- ③休工期間中は、協力会社が2名常駐し、2回／日の現場巡回点検を実施します。
- ④巡回点検時には遮へい板の異常の有無や出入口ゲート等の施錠を中心に確認します。
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時にも巡回点検を行い異常の有無を確認します。

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 八幡 一夫（公田地区掘割試験工事 担当）
TEL. 045-352-3771（代表）

施工者：公田地区掘割試験工事
(株)大林組
現場代理人 飯谷 隆 TEL. 045-435-5809
