

「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、8月から10月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

【夏季休暇の期間】


令和元年8月15日（木）～8月18日（日）は休工とします

作業箇所

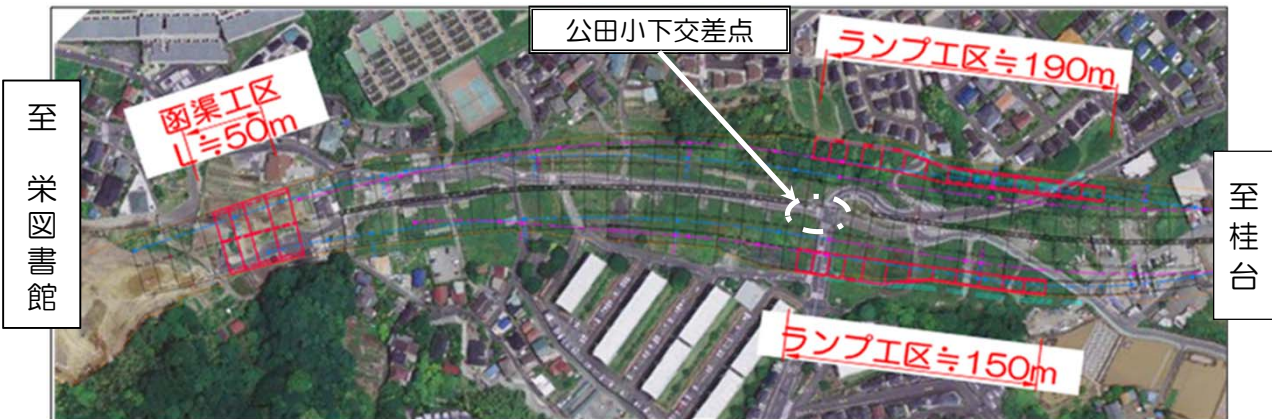


この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

函渠工区


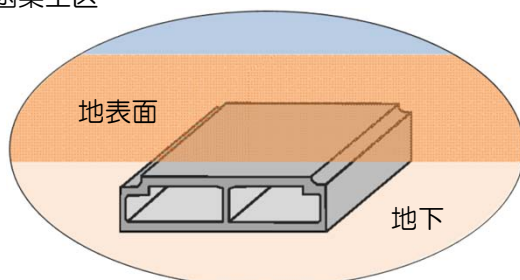


ランプ工区

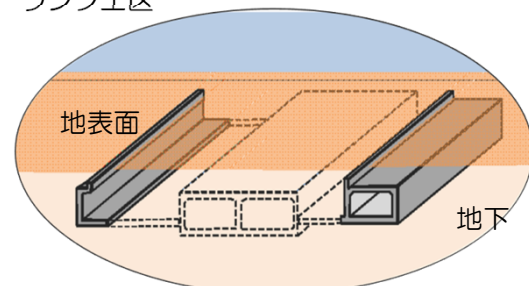

※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

公田町付近の主な工事について

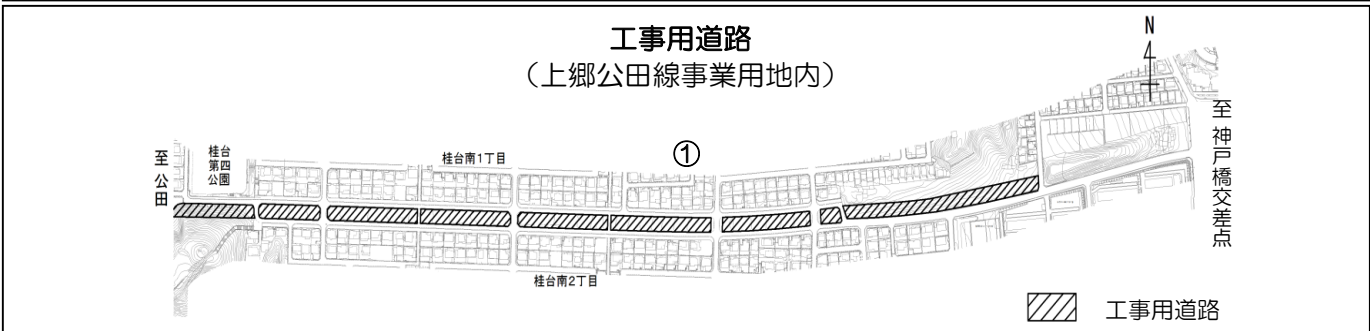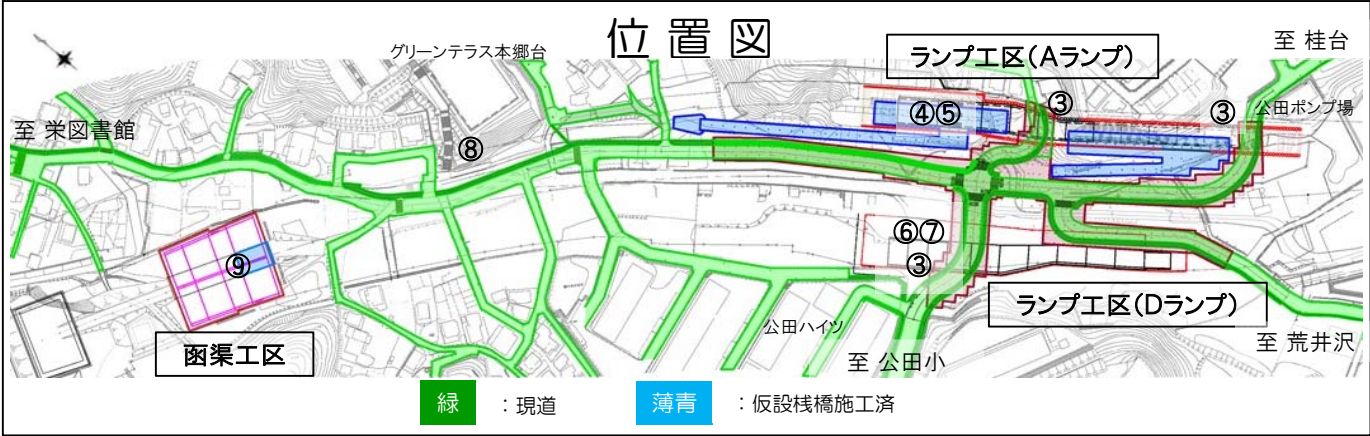

【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所	主な作業内容	この先3ヶ月の作業予定			
		8月	9月	10月	
工事用道路	① 桂台工事用道路	[Progress bar spanning Aug, Sep, Oct]			
	② 切土工	[Progress bar spanning Aug, Sep, Oct]			
ランプエ区	Aランプ [山側斜面周辺 公田ポンプ場周辺]	③ 下水道切回し工	[Progress bar spanning Aug, Sep, Oct]		
		④ 構築工	[Progress bar spanning Aug, Sep, Oct]		
		⑤ 埋戻し工	[Progress bar spanning Sep, Oct]		
	Dランプ [公田ハイツ周辺]	③ 下水道切回し工	[Progress bar spanning Aug, Sep, Oct]		
		⑥ 土留工	[Progress bar spanning Sep, Oct]		
	⑦ 掘削工	[Progress bar spanning Oct]			
	グリーンテラス 本郷台	⑧ 階段移転	[Progress bar spanning Aug, Sep, Oct]		
函渠工区	⑨ 仮設物撤去工	[Progress bar spanning Aug, Sep]			

- ① 桂台工事用道路 : 桂台工事用道路の維持管理を行います。
 - ② 切土工 : 工事用道路を造るため、斜面を掘削します。
 - ③ 下水道切回し工 : 道路に埋設された下水道を別の位置に迂回させます。
 - ④ 構築工 : 鉄筋コンクリートにより、ボックスカルバートを構築します。
 - ⑤ 埋戻し工 : 地中に構築物ができた箇所から埋戻しを行い、鋼材の支えを撤去します。
 - ⑥ 土留工 : 構築物を構築するための掘削を行う際に、土留めとなる鋼矢板を設置します。
 - ⑦ 掘削工 : 構築物を地中に構築するために地面を掘削します。
 - ⑧ 階段移転 : グリーンテラス本郷台前で、階段の移設を行います。
 - ⑨ 仮設物撤去工 : 鉄筋コンクリートを下から支えている型枠支保工を撤去します。
- ・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

工事進捗状況



【進捗状況写真】

令和元年8月2日撮影



夏季休暇期間中の安全対策について

- ①夏季休暇前までに一斉点検を実施します。
- ②工事箇所出入口部及び工事用道路出入口部の門扉は強固に固定し施錠します。
- ③休工期間中は、協力会社が2名常駐し、2回／日の現場巡回点検を実施します。
- ④巡回点検時には遮へい板の異常の有無や出入口ゲート等の施錠を中心に確認します。
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時にも巡回点検を行い異常の有無を確認します。

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 及川 叙二（公田地区掘割試験工事 担当）
TEL. 045-352-3771（代表）

施工者：公田地区掘割試験工事
(株)大林組
現場代理人 飯谷 隆 TEL. 045-435-5809
