

# 「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、5月から7月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

## 作業概要

### 【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工  
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止

### 【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

### 【大型連休】


令和2年4月20日（月）～令和2年5月6日（水）は休工とします  
※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止を目的として、長期の休工となっています

## 作業箇所




この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

函渠工区

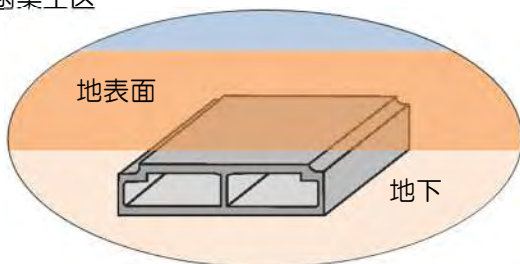


ランプ工区

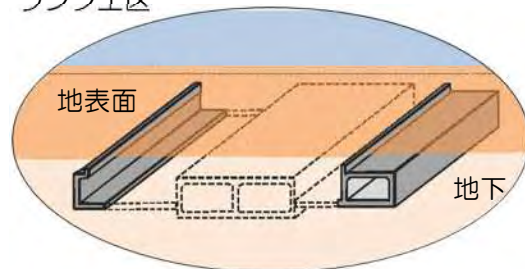

※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

## 公田町付近の主な工事について

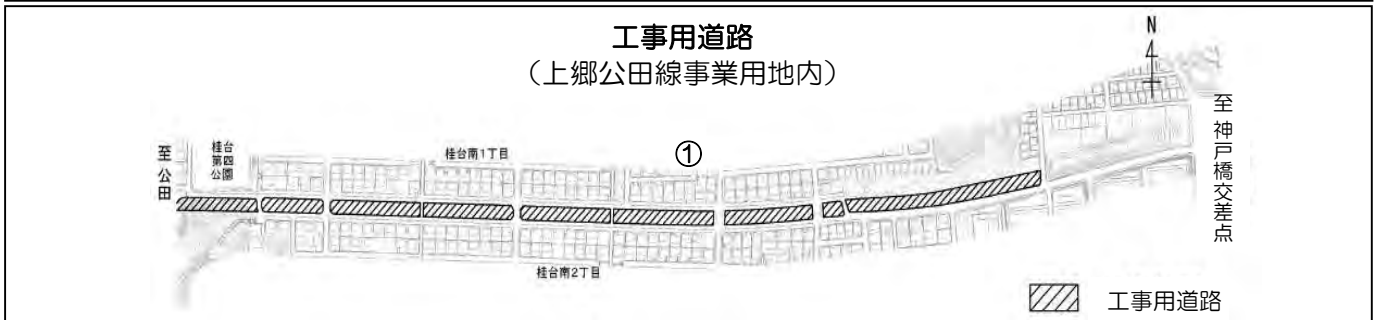

### 【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所	主な作業内容	この先3ヶ月の作業予定		
		5月	6月	7月
工事用道路	① 桂台工事用道路	▬		
	② 切土工	▬	▬	▬
ランプエ区	Aランプ [山側斜面周辺]	③ 下水道切回し工	▬	▬
		④ 埋戻し工	▬	▬
		⑤ 構築工		▬
	Dランプ [公田ハイッ周辺]	⑥ 仮設棧橋撤去工		▬
		④ 埋戻し工	▬	
		⑤ 構築工	▬	▬

- ① 桂台工事用道路 : 桂台工事用道路の維持管理を行います。
- ② 切土工 : 工事用道路を造るため、斜面を掘削します。
- ③ 下水道切回し工 : 道路に埋設された下水道を別の位置に迂回させます。
- ④ 埋戻し工 : 地中に構造物ができた箇所から埋戻しを行い、鋼材の支えを撤去します。
- ⑤ 構築工 : 鉄筋コンクリートにより、ボックスカルバートを構築します。
- ⑥ 仮設棧橋撤去工 : 鋼材でできている工事用の通路を撤去します。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

## 工事進捗状況



### 【進捗状況写真】

令和2年4月9日撮影

I 函渠工区 施工状況



II ランプ工区 (Aランプ) 施工状況



III ランプ工区 (Dランプ) 施工状況



IV グリーンテラス本郷台 施工状況



## 大型連休休工期間中の安全対策について

- ①休工前までに一斉点検を実施します。
- ②工事箇所出入口部及び工事用道路出入口部の門扉は強固に固定し施錠します。
- ③休工期間中は、協力会社が2名常駐し、2回／日の現場巡回点検を実施します。
- ④巡回点検時では、以下の確認を行います。
  1. 工事箇所出入口の施錠確認
  2. 仮囲いおよび門扉の異常の有無
  3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
  4. 現場休憩所の施錠確認
  5. 現場休憩所の異常の有無
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時にも巡回点検を行い異常の有無を確認します。

### 【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所  
桂公田工事区 工事長 及川 叙二 (公田地区掘割試験工事 担当)  
TEL. 045-439-0180 (代表)

施工者：公田地区掘割試験工事  
(株)大林組  
現場代理人 飯谷 隆 TEL. 045-435-5809
