

「横浜環状南線 公田笠間トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、3月から5月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止

【作業時間】


原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

作業箇所

【工事箇所】




回転立坑イメージ

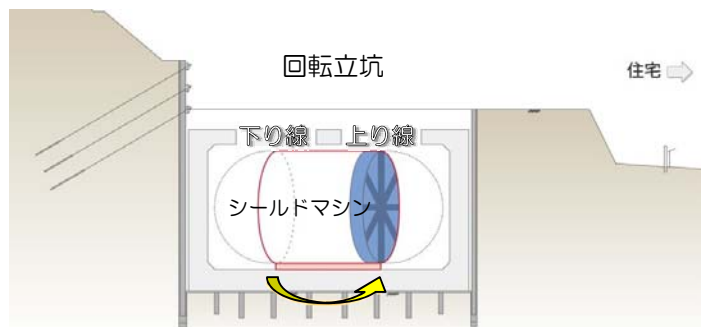

シールドマシン回転イメージ

公田町付近の主な工事について

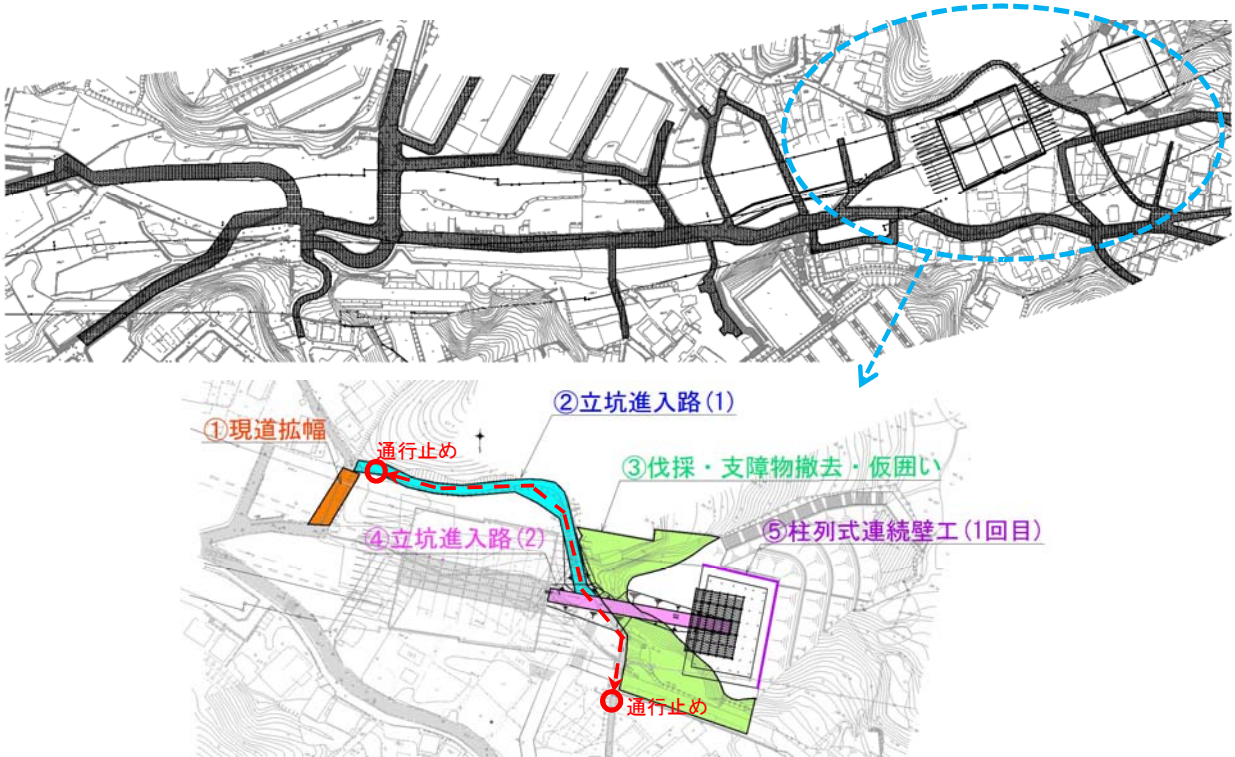

【作業工程表及び主な作業内容】

作業内容	作業予定					
	3月		4月		5月	
① 現道拡幅	ダンプ走行あり					
通行止め		3月下旬より通行止め予定				
② 立坑進入路(1)		ダンプ走行あり				
③ 伐採・支障物撤去・仮囲い						
④ 立坑進入路(2)			ダンプ走行あり			
⑤ 柱列式連続壁工(1回目)					ダンプ・大型車走行あり	

① 現道拡幅	工事用車両の通行に備えて、現況道路を拡幅します。
② 立坑進入路(1)	通行止め後、工事用車両の進入路を整備します。
③ 伐採・支障物撤去・仮囲い	進入路(1)施工後、作業エリアの草刈りと伐採をします。
④ 立坑進入路(2)	伐採施工後、山腹まで登っていくための工事用車両の進入路を作ります。
⑤ 柱列式連続壁工(1回目)	山腹の作業ヤードで、掘削するための山留め(柱列式連続壁)を施工します。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

【工事進捗状況】

工事着手予定・・・平成29年3月上旬



平成28年10月撮影



安全対策について

- ①子供などが工事ヤード内に容易に入れないよう仮囲い及び門扉を設置します。
- ②仮囲い隅角部はクリアパネル又は隅切りを行い見通しを確保します。
- ③仮囲いの異常の有無を巡回点検にて確認します。
- ④車両の出入がある時は車両出入り口部にガードマンを配置し、車両の誘導を行います。
- ⑤ガードマンは歩行者、一般車両を最優先とした車両の誘導を行います。
- ⑥車両出入り口ゲートに出入口表示看板を設置します。
- ⑦一般車と工事関係車両の区別をするため、工事用車両プレートで表示します。
- ⑧工事用道路の通行は15km/hで走行します。
- ⑨ダンプの荷台はネットにより、軽量・小型資機材等の飛散防止対策を行います。

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
岩瀬笠間工事区 工事長 富田 芳男(公田笠間トンネル工事 担当)
TEL. 045-352-3771 (代表)

施工者：公田笠間トンネル工事
鹿島・竹中土木・佐藤工業JV
現場代理人 坪内 範和 TEL. 045-443-9843
