


横浜環状南線 公田笠間トンネル工事地表面計測結果のお知らせ

【シールドマシン位置図】

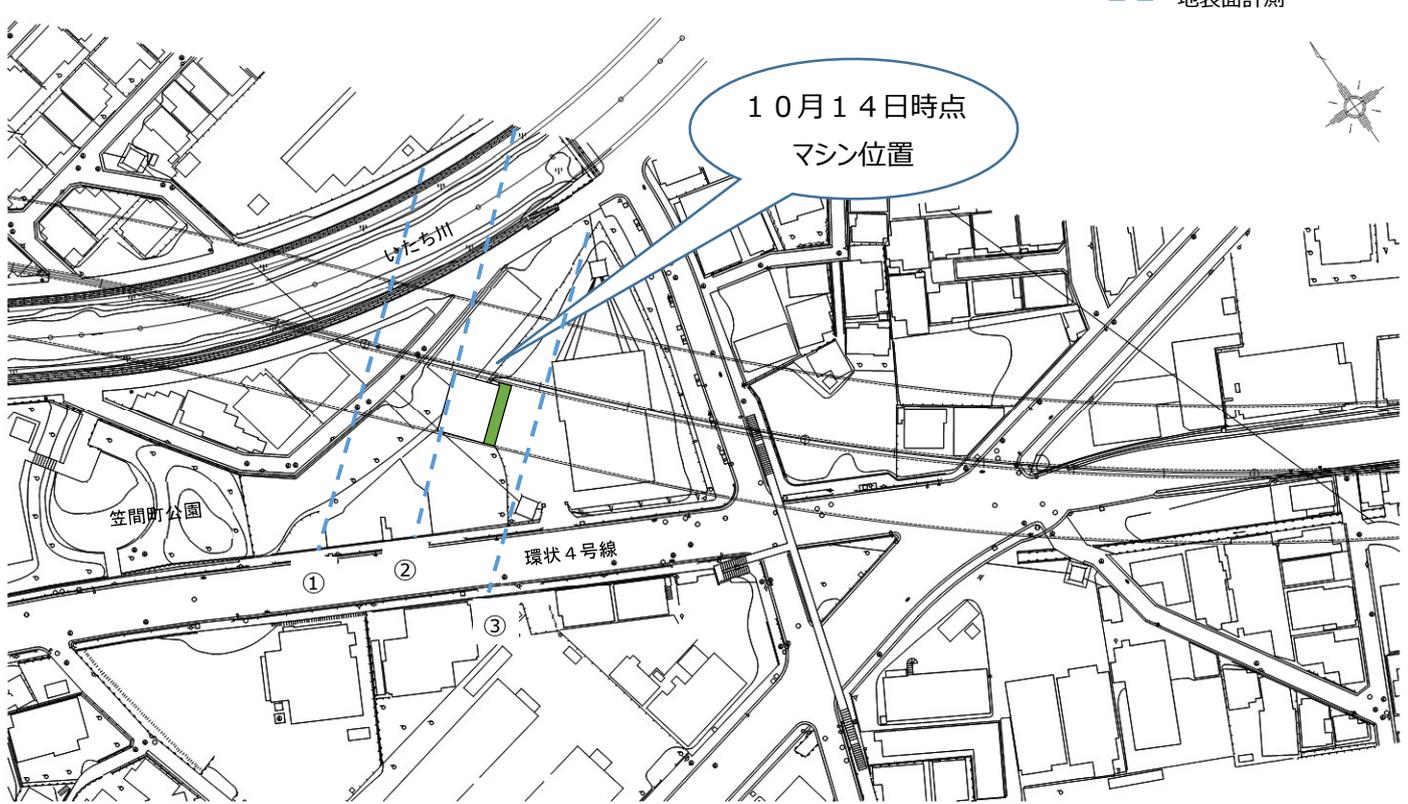

【地表面計測結果】

測線	基準日	計測日	最大傾斜角※1 (rad)	最大鉛直変位 (mm)
測線①	2022年9月22日	2022年10月14日	0.0/1000	+1
測線②	2022年9月22日	2022年10月14日	0.1/1000	-3
測線③	2022年9月22日	2022年10月14日	0.1/1000	+3

※1. 最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています

※家屋に影響を与えない地盤変位の目安は、地表面傾斜角 1/1,000 rad 以下となります。「建築学会小規模建築物基礎設計の手引き 1998 年」の記載を参考に設定しています。
