


横浜環状南線 公田笠間トンネル工事地表面計測結果のお知らせ

【シールドマシン位置図（1月14日時点）】

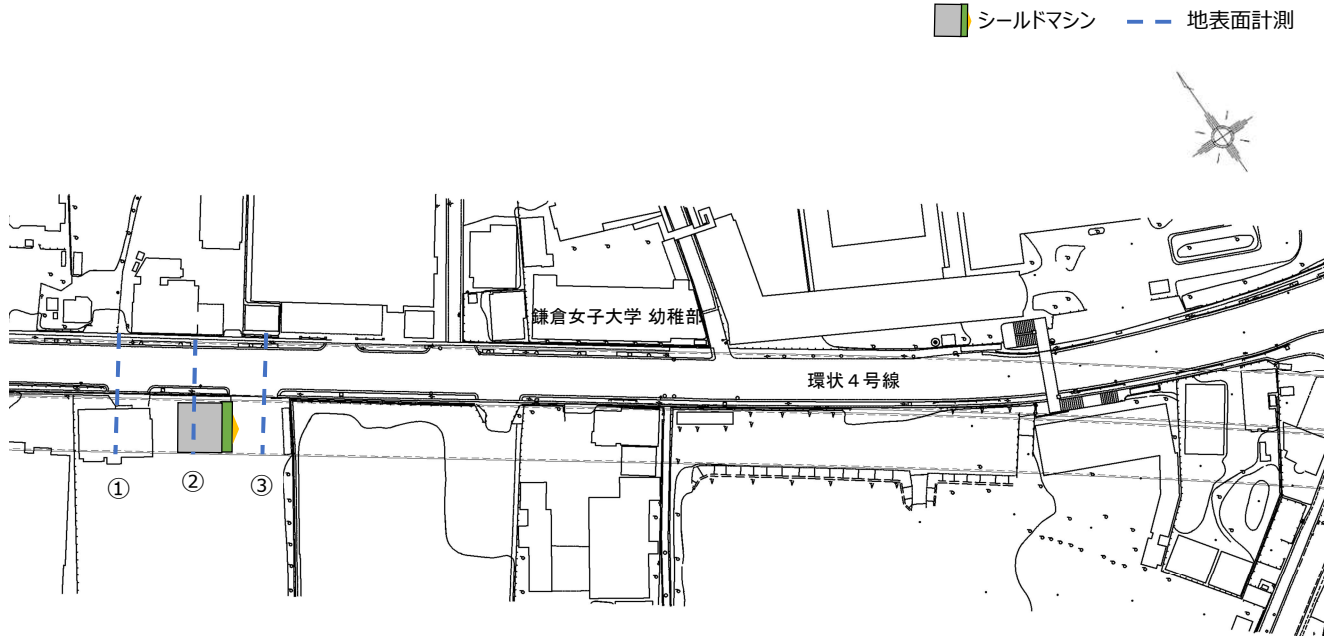

【地表面計測結果】

側線	基準日	計測日	最大傾斜角※1 (rad)	最大鉛直変位 (mm)
測線①	2023年12月16日	2023年1月14日	0.4/1000	- 2
測線②	2023年12月19日	2023年1月14日	0.1/1000	+ 2
測線③	2023年12月21日	2023年1月14日	0.3/1000	+ 4

※ 1. 最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています

