


横浜環状南線 桂台トンネル工事地表面計測結果のお知らせ

【シールドマシン位置図】

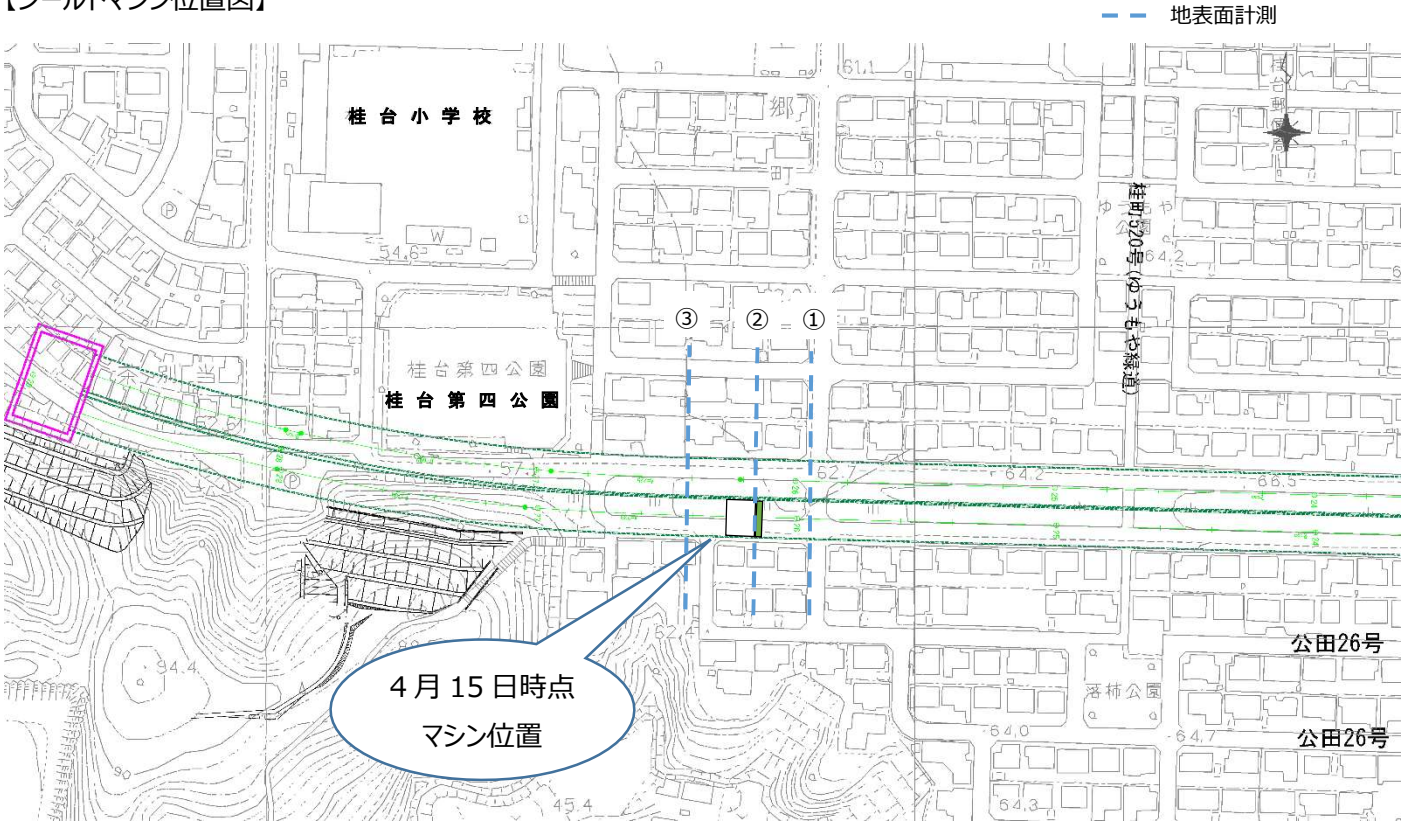

【地表面計測結果】

測線	基準日	計測日	最大傾斜角※1※2 (rad)	最大鉛直変位※2 (mm)
測線①	2020年12月2日	2024年4月15日	0.1/1000	+3
測線②	2020年12月2日	2024年4月15日	0.1/1000	+3
側線③	2020年12月2日	2024年4月15日	0.1/1000	+3

※1. 最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています。

※2. 用地境界から外側にかけて計測した範囲にて計測した値について最大値を示しています。

