

「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、5月から7月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。


作業概要

- ◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- ◆作業時間 原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時
- ◆大型連休の期間
平成31年4月28日、30日
令和元年5月1日、3日～6日は休工とします。

作業箇所




工事用道路

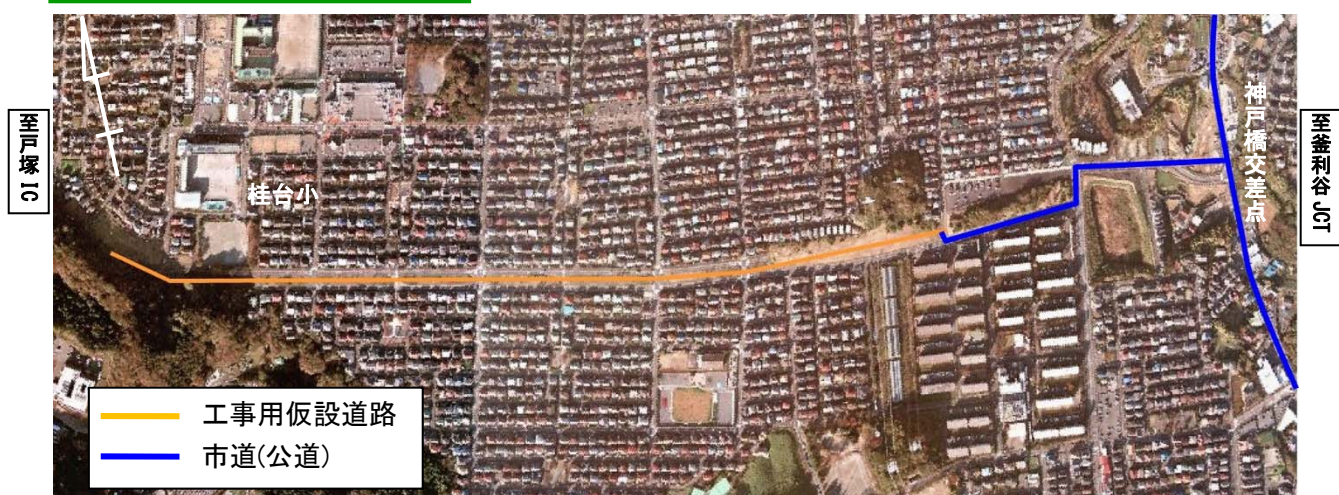


完成イメージ図


橋梁下部工部

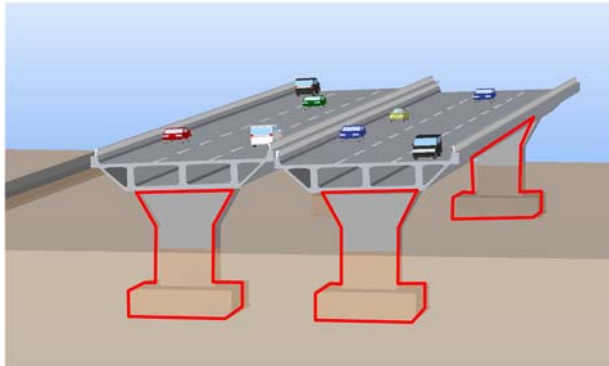


土工部

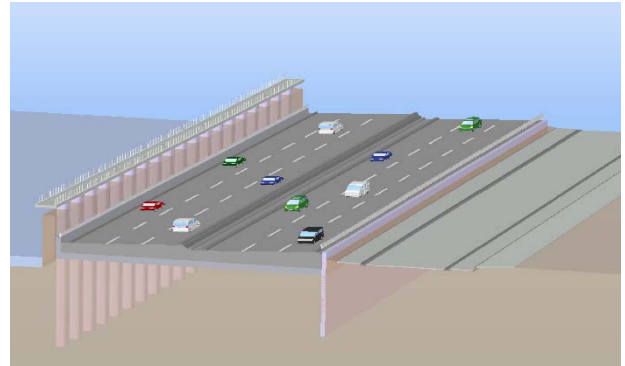


函渠部

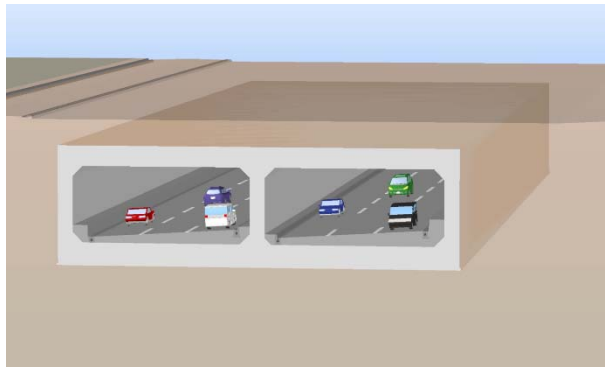

立坑部

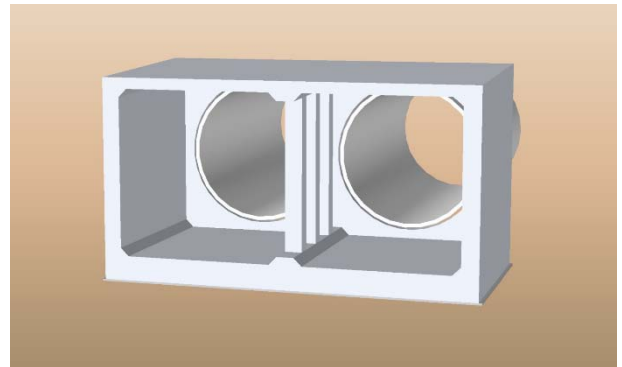

シールドトンネル部

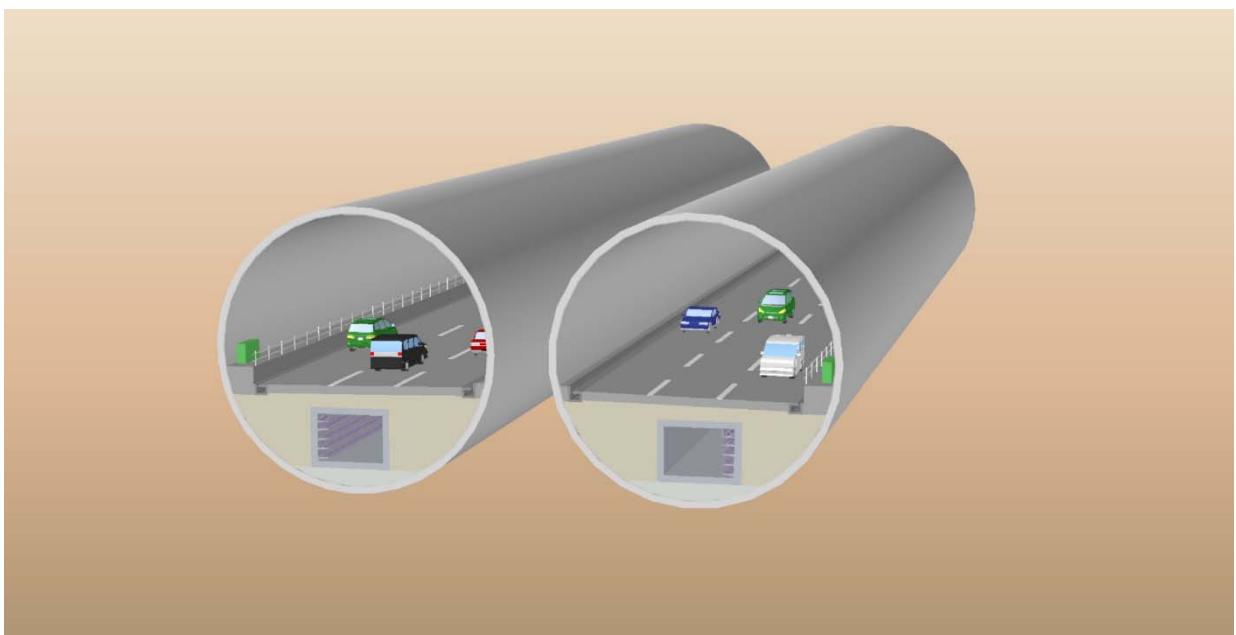

作業工程表

作業箇所	この先3カ月の作業予定			
	主な作業内容	5月	6月	7月
橋梁下部工区	① 躯体構築(A2)			
	② 躯体構築(P2)			
	③ 付替道路			
	④ 付替水路			
土工区	⑤ 鋼管連壁工			
	⑥ 管理用通路			
函渠工区	⑦ 躯体構築			
発進立坑工区	⑧ 発進設備工			
	⑨ 設備工			
	⑩ シールドマシン組立			
回転立坑工区	⑪ 躯体構築			

・天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

主な作業内容

- ①②躯体構築：P2橋脚、A2橋台の構築と埋戻しをする工事です。
- ③付替道路：市道406号の道路を新しく付替える工事です。
- ④付替水路：A1橋台、P1橋脚付近の水路を新しく付替える工事です。
- ⑤⑥鋼管連壁工、管理用通路：調整池改修による工事です。
- ⑦⑪躯体構築：鉄筋を組立て、コンクリートを型枠に流し込み、函渠を構築する工事です。
- ⑧発進設備工：シールドマシンを発進させるための土台を設置する工事です。
- ⑨設備工：シールドマシンに必要な電力設備や防音ハウスを設置する工事です。
- ⑩シールドマシン組立：トンネルを掘削するシールドマシンを組立てる工事です。

大型連休休工期間中の安全対策

- ①休工前は一斉点検を行います。
- ②工事箇所出入口の門扉は強固に固定し、施錠を行います。
- ③休工期間中は、施工者職員が1名常駐し、2回/日の現場巡回点検を行います。
- ④巡回点検では、以下の確認を行います。
 - 1. 工事箇所出入口の施錠確認
 - 2. 仮囲いおよび門扉の異常の有無
 - 3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
 - 4. 現場休憩所の施錠確認
 - 5. 現場休憩所の異常の有無
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時も施工者職員が巡回点検を行い異常の有無を確認します。

工事進捗状況

写真撮影位置図



■状況写真(4月17日撮影)



【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所
 上郷桂台工事区 工事長 棟方 貴史 TEL. 045-352-3771 (代表)
 施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV
 現場代理人 松村 英樹 TEL. 045-392-3985
