

「横浜環状南線 桂台公田地区整備工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、2月の主な作業の予定と1月末の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

作業概要

- ◆作業時間 : 8時～17時（原則として土・日・祝日を除く）
- ◆作業内容 : 造成、土運搬、簡易舗装、伐採、チップ、土工

作業工程表

作業箇所	1月の進捗状況	2月の作業予定						
		作業内容		10		20		29
桂台地区	工事完了							
公田東地区	構造物取壊完了	① 造成						
		② 土運搬						
		③ 簡易舗装						
		④ チップ						
公田西地区	工事用道路完了	① 伐採						
		② 土工						
		③ 土運搬						

・天候の状況により作業工程は変更になる場合があります。

主な作業内容

- 伐採・チップ：伐採木を破碎後、チップ材として植樹工事で再利用する工事です。限りある資源を有効活用する“緑のリサイクル”を実施します。
- 造成 : 付替・工事用道路を整備するための造成工事です。
- 土工 : 山を掘り取る工事です。
- 簡易舗装 : 工事用車両が通れるようにアスファルトを敷設する工事です。

工事用車両（土運搬）

◆通行予定時期

- 工 種：土砂搬出
- 車 種：10t ダンプトラック
- 1日当たりの台数：7台×6回程度
- 土砂搬出期間：平成24年1月～平成24年7月

◆通行ルート

別図1を参照して下さい

◆通行時間

9：00～17：00

◆工事用車両通行における対策


- ①土砂搬出車両の通行は、通学時間帯を避け9時から通行いたします。児童の下校時間帯はばらばらになると思いますので、土砂搬出車両の通行がある日には、別図1に表記しています箇所に交通誘導員を配置します。また、交通誘導員は各自携帯無線を常備しており、児童の下校時においては、土砂搬出車両の運行状況を全誘導員が共有し、誘導を行います。
- ②土砂搬出車両の運搬会社及びそこに所属するドライバーには、道路交通法の厳守は勿論のこと、過積載を完全防止するため、事業用地内に車両重量計を設置し、土砂搬出全車両の積載荷重を計測します。また、指定した運搬ルート、運行時間、走行速度の厳守、指定した場所での駐車を厳守するため、土砂搬出車両の運行管理を実施します。
- ③道路汚染対策としまして、現場内には舗装などを敷くとともに、車両清掃員を配置し土砂搬出車両のタイヤに付着した泥等を落とします。また、土砂搬出の際には、土砂積込み後の荷台にシートを張り、運搬中の環境対策に努めます。

作業箇所

桂台地区



公田東地区

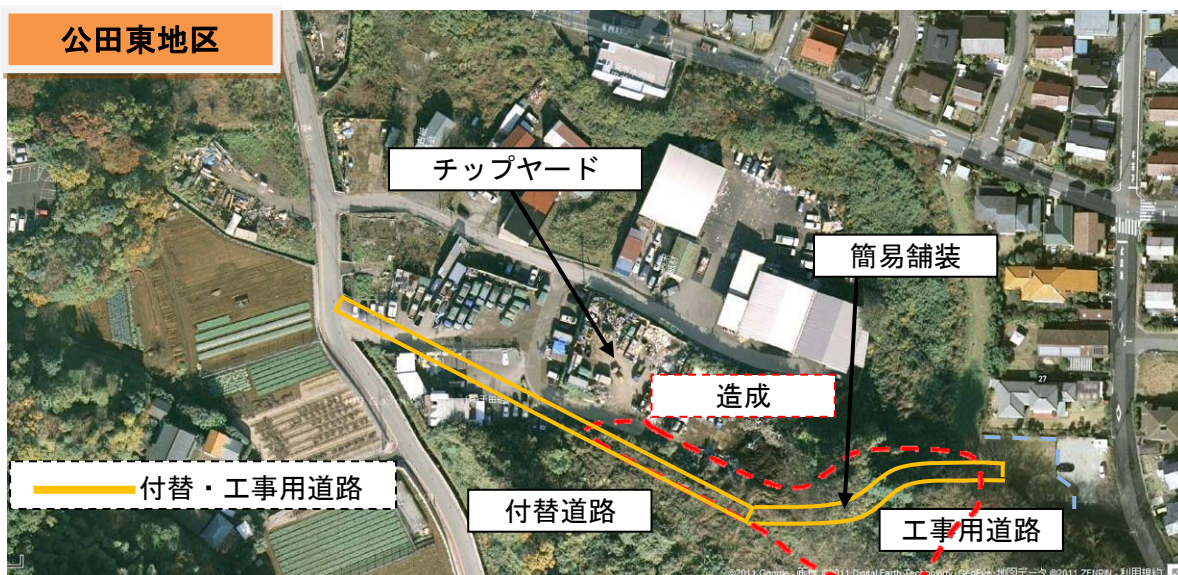

公田西地区



工事進捗状況

■箇所：公田東地区



■箇所：公田西地区



■写真①



■写真②



【連絡先】


発注者：東日本高速道路(株)関東支社 横浜工事事務所 栄西工事区
Tel. 045-352-3771 (代表)

施工者：(株)神奈川フェンス土木
現場代理人 大関 隆吾輝 Tel. 045-861-7100

横浜環状南線桂台公田地区整備工事の概要図

凡 例

- 土運搬ルート【市道】
- 【本線内工事用道路整備】
- 【付替道路整備】
- 【仮設歩道】
- ★ 交通誘導員配置予定箇所

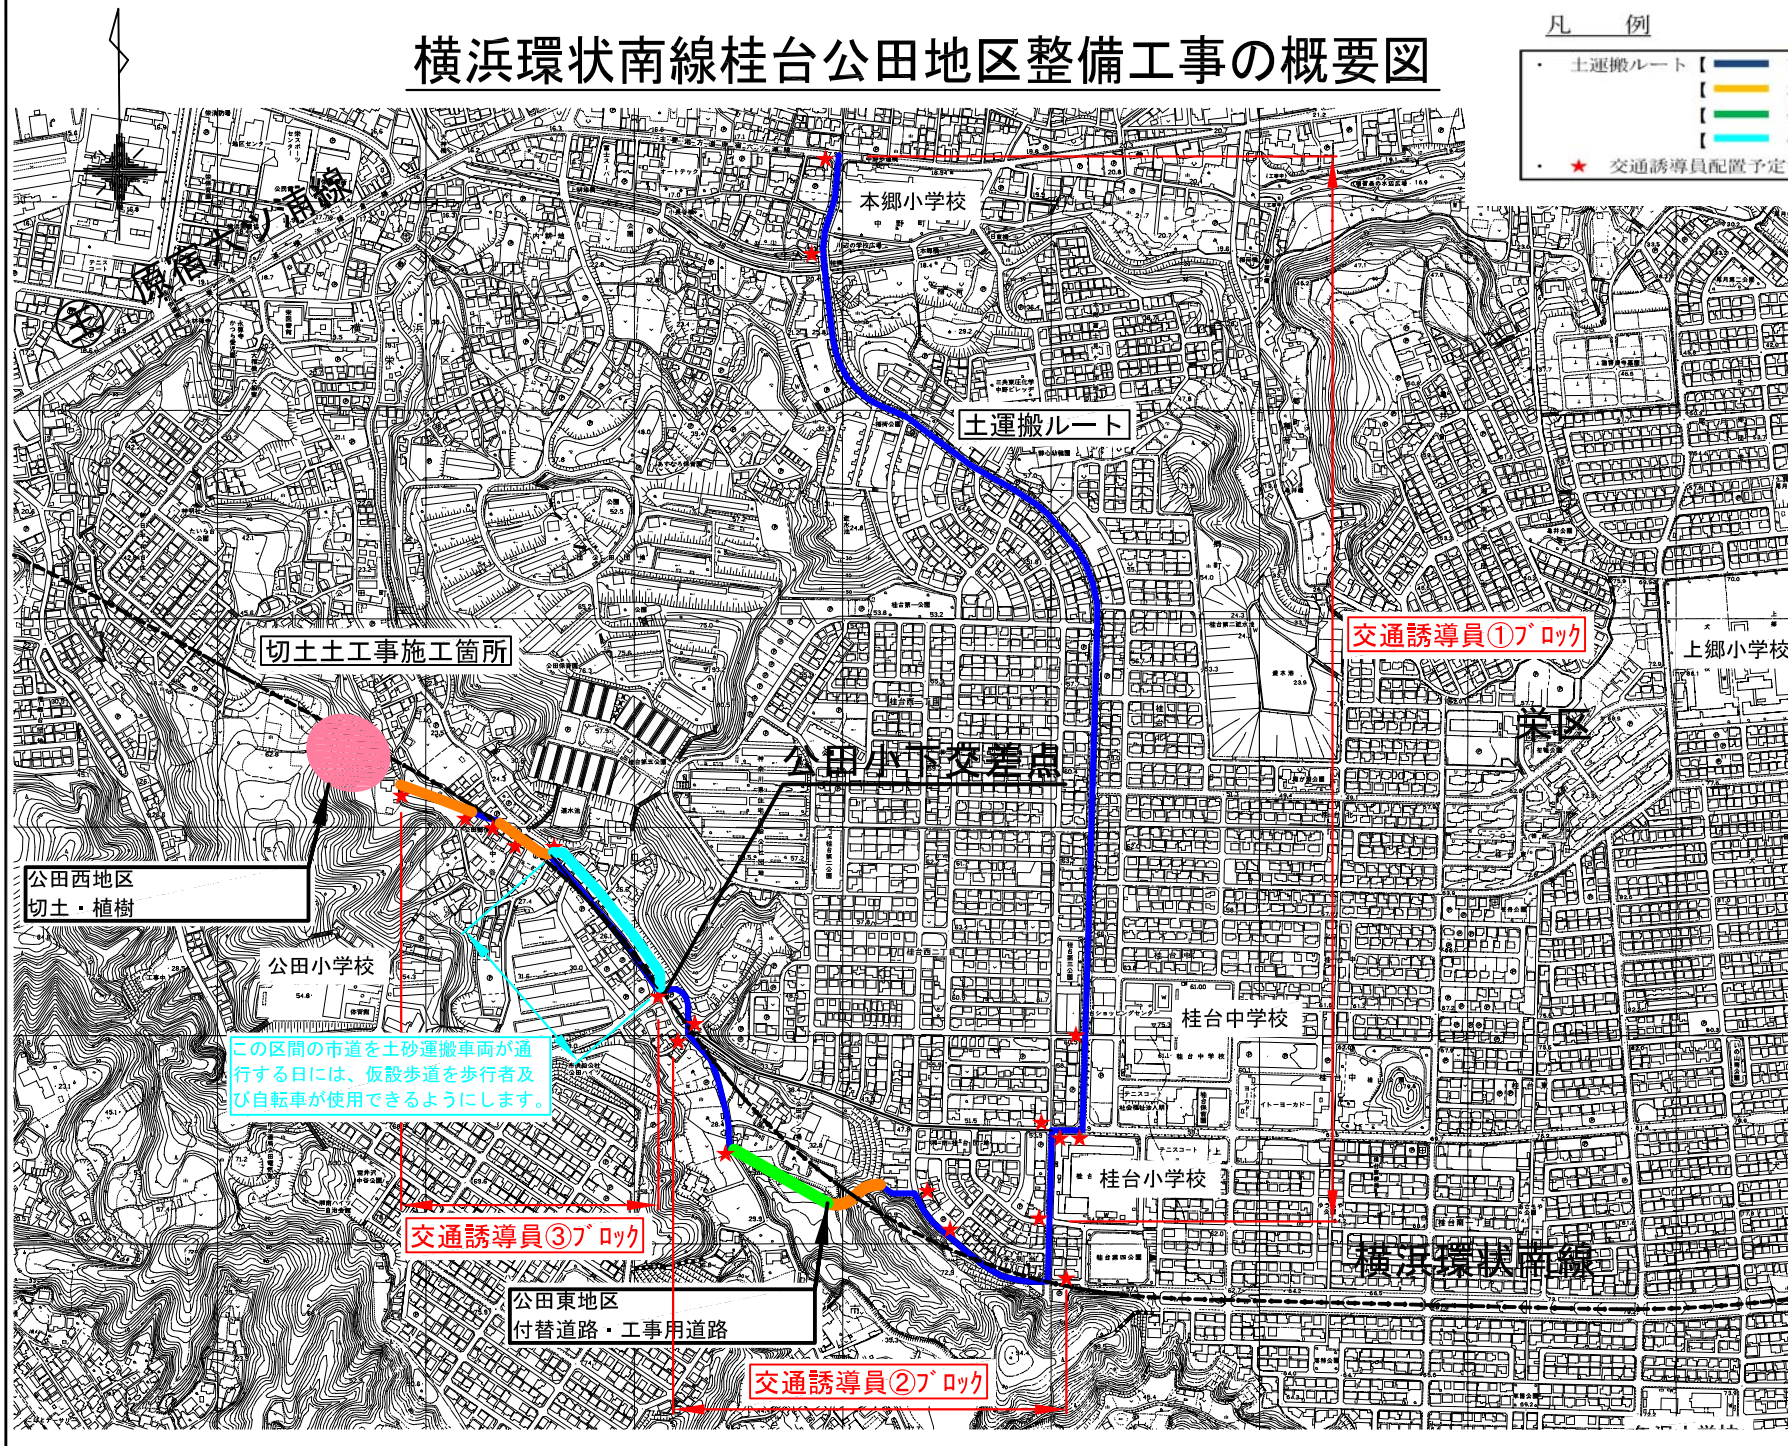

横浜環状南線 桂台・公田地区整備工事	
図面の種類	横浜環状南線桂台・公田地区 整備工事の概要図
縮 尺	図面番号 /
設計会社名	東日本高速道路(株)関東支社
事務所名	横浜工務事務所
